



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** NÚMERO **09178002-022-2020**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"ADECUACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA DE PATIOS DE ALMACENAMIENTO DE LA ISLA DEL CAYACAL EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH."**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 10:00 horas del día 21 de octubre del año 2020, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V, sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el **Ing. Juan Carlos Reyes Villagómez**, Subgerente de Construcción y Mantenimiento, facultado mediante oficio número DG-930-20, de fecha 30 de septiembre de 2020, actuando en nombre y representación de la APILAC.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **16 (dieciséis) proposiciones** de los siguientes licitantes:

- ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.
- CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.
- CORVE PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
- CRICE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.





ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

- EMPORIO VANGUARDIA CIVIL, S.A. DE C.V.
- GRUPO FMMDAM, S.A. DE C.V.
- GRUPO INMOBILIARIO FACE, S.A. DE C.V.
- INSTALACIONES TERMICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.
- LZC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
- PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
- SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.
- SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.

Procedimiento: 1024658 - ADE: x

compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/modify/rfq.do?from=menu&_ncp=1503294759556.2264104.1

10:39 a. m. CST - Central America Time DST

Beatriz Ayala Ro...

CompraNet

Inicio Evaluación

Procedimiento: 1024658 - ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA DE PATIOS DE ALMACENAMIENTO DE LA ISLA CAYACAL EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente: 2169505 - ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA DE PATIOS DE ALMACENAMIENTO

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 21/10/2020 10:00 a. m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Apertura de proposiciones | Falle | Discusiones | Mensajes Unidad Comisaría y Licitantes

Monitor de Participación del Licitante | Análisis de propuestas de Proposiciones | Mail | Búsqueda del Procedimiento

Monitor de Participación del Licitante

Analizar y validar la ficha de cliente | Descargar listado de Anexos | Descargar listado de Historias

Licitantes Invitados: 22	Proposiciones Recibidas: 10						
SSB	Usuarios	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviada	Proposición	Forma Técnica	Anexos
1	ASESORIA SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A. DE C.V.	08/10/2020 09:45 a. m.	Completado	TE	0	0	0
2	COI DIGITAL SA DE CV	13/10/2020 09:02 p. m.	No hay Proposición	..	1	0	0
3	CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL	03/10/2020 09:28 p. m.	Completado	TE	0	0	0
4	CONSTRUCTORA SUR DE MICHOCAN SA DE CV	09/10/2020 11:12 a. m.	Completado	TE	0	0	0
5	CONSTRUCTORA VELUMAR SA DE CV	20/10/2020 01:24 p. m.	Completado	TE	0	0	0
6	CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RIA SA DE CV	12/10/2020 02:30 p. m.	Completado	TE	0	0	0
7	CONVE PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV	15/10/2020 10:28 a. m.	Completado	TE	0	0	0
8	CRUCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	07/10/2020 10:08 a. m.	Completado	TE	0	0	0

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
LEONA VICARIO
REPRESENTA MADRE DE LA PATRIA



Procedimiento: 1024658 - ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA DE PATIOS DE ALMACENAMIENTO DE LA ISLA DEL CAYACAL EN EL PUERTO

Nº	Nombre de la Empresa	Fecha de Recepción	Estado	TE	OT	OT	OT
1	CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACÁN SA DE CV	09/10/2020 11:12 a.m.	Completado	TE	0	0	0
2	CONSTRUCTORA VELMAR SA DE CV	20/10/2020 09:31 a.m.	Completado	TE	0	0	0
3	CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA SA DE CV	12/10/2020 02:10 a.m.	Completado	TE	0	0	0
4	CONVE PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV	19/10/2020 10:19 a.m.	Completado	TE	0	0	0
5	CPCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	07/10/2020 10:58 a.m.	Completado	TE	0	0	0
6	EMPORIO VANGUARDIA CIVIL SA DE CV	09/10/2020 03:19 a.m.	Completado	TE	0	0	0
7	GRUPO FUNDADA SA DE CV	20/10/2020 10:34 a.m.	Completado	TE	0	0	0
8	GRUPO IBAÑOLARIO FACE SA DE CV	09/10/2020 08:58 a.m.	Completado	TE	0	0	0
9	GRUPO PRODUCTOR DE INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE MIPRO SA DE CV	13/10/2020 10:11 a.m.	No hay Proposición	---	0	0	0
10	INSTALACIONES TERMICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV	09/10/2020 03:38 a.m.	Completado	TE	0	0	0
11	JORGE HERNANDEZ LLERA AMEZQUA	17/10/2020 07:32 a.m.	No hay Proposición	---	0	0	0
12	LZC CONSTRUCTORA SA DE CV	13/10/2020 05:26 a.m.	Completado	TE	0	0	0
13	OBRA CIVIL TRITURACIÓN Y MAQUINARIA SA DE CV	11/10/2020 11:32 a.m.	Completado	TE	0	0	0
14	PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV	16/10/2020 09:26 a.m.	Completado	TE	0	0	0
15	RICARDO AGUILAR MEDALDO	11/10/2020 11:32 a.m.	No hay Proposición	---	0	0	0
16	SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS SA DE CV	12/10/2020 09:59 a.m.	Completado	TE	0	0	0
17	SOLANISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR SA DE CV	20/10/2020 08:08 a.m.	Completado	TE	0	0	0
18	TAG SISTEMAS MEDCOS	07/10/2020 09:58 a.m.	No hay Proposición	---	0	0	0
19	TRIVAR SA DE CV	14/10/2020 08:55 a.m.	Definitiva Proposición	---	0	0	0

Nº Proposiciones recibidas: 16

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose las **16 (dieciséis)** proposiciones para su REVISIÓN DETALLADA.

Procedimiento: 1024658 - ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA DE PATIOS DE ALMACENAMIENTO DE LA ISLA DEL CAYACAL EN EL PUERTO

Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organismos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sujeta a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la omisión de algún documento que respalde su consulta.

No existen proveedores con esta búsqueda: ASERORIA, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V.



INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
ARREES SA DE CV
A AND P INTERNACIONAL
A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
AES CONSTRUCTION GROUP, S.A. DE C.V.
A-D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
AARON VERA MORALES
AARON VERA MORALES
ABAMCU, S.A. DE C.V.
ATA SANCION, S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
LEONA VICARIO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN





Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
LEONA VICARIO
RECONOCIMIENTO NACIONAL DE LA PATRIA

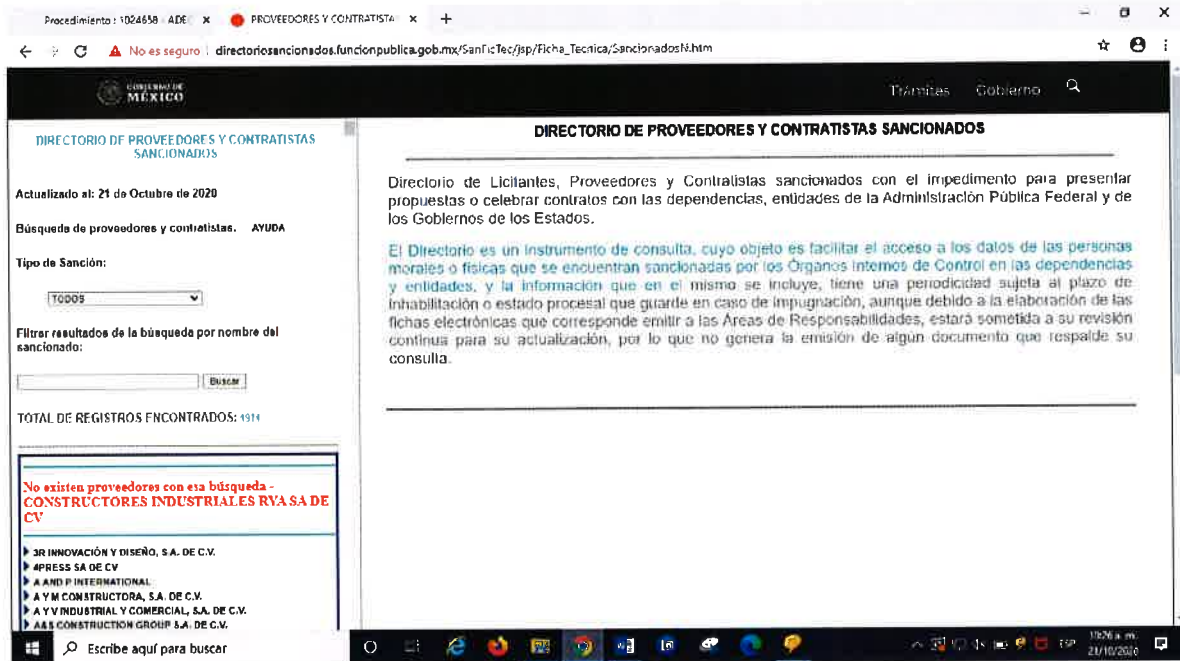



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



LÁZARO CÁRDENAS

COOPERACIÓN GUBERNAL
DE INICIATIVAS Y PROYECTOS ALTERNATIVOS

GERENCIA DE INGENIERÍA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. 09178002-022-2020

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Procedimiento: 1024658 - ADE x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

No es seguro | directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/fsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado el: 21 de Octubre de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filter resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1914

No existen proveedores con esa búsqueda - CORVE PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ASS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A-D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 1024658 - ADE x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

No es seguro | directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/fsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado el: 21 de Octubre de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filter resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1914

No existen proveedores con esa búsqueda - CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ASS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A-D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
LEONORA VICARIO
SECRETARÍA NACIONAL DE LA PATRIA



Procedimiento: 1024858 - ADE: x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 21 de Octubre de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

BUSCAR

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1914

No existen proveedores con esa búsqueda - EMPORIO VANGUARDIA CIVIL SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A-D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 1024858 - ADE: x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 21 de Octubre de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

BUSCAR

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1914

No existen proveedores con esa búsqueda - GRUPO FMDM SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A-D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.





Procedimiento: 1024658 - ADE: x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/ficha_Tecnica/Sancionados4.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 21 de Octubre de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

BUSCAR

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 4944

No existen proveedores con esa búsqueda - GRUPO INMOBILIARIO FACE SA DE CV

- ▶ JR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A S S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A-D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

Procedimiento: 1024658 - ADE: x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/ficha_Tecnica/Sancionados4.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 21 de Octubre de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

BUSCAR

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 4944

No existen proveedores con esa búsqueda - INSTALACIONES TERMICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV

- ▶ JR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A S S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A-D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
LEONA VICARIO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Procedimiento: 1024658 - ADE: x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS: x

No es seguro | directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 21 de Octubre de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1914

No existen proveedores con esa búsqueda - LZC CONSTRUCTORA SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 1024658 - ADE: x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS: x

No es seguro | directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 21 de Octubre de 2020

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1914

No existen proveedores con esa búsqueda - OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.



El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.


Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx




2020
LEONA VICARIO
SECRETARÍA DE ENERGÍA Y ALIMENTACIÓN

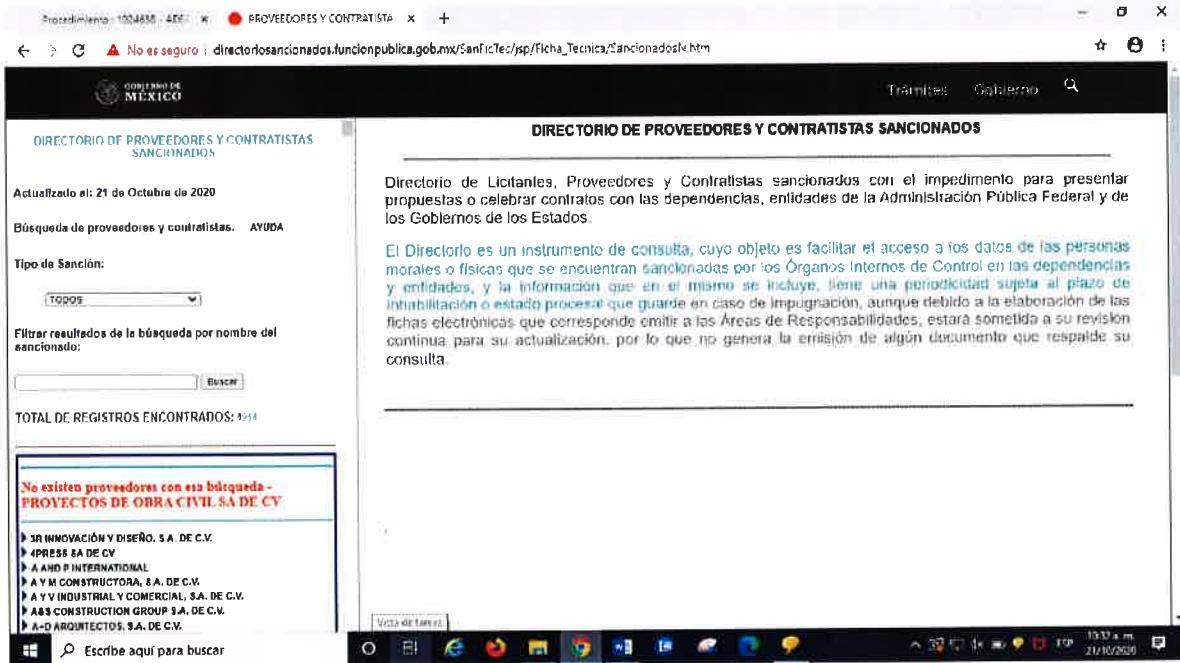

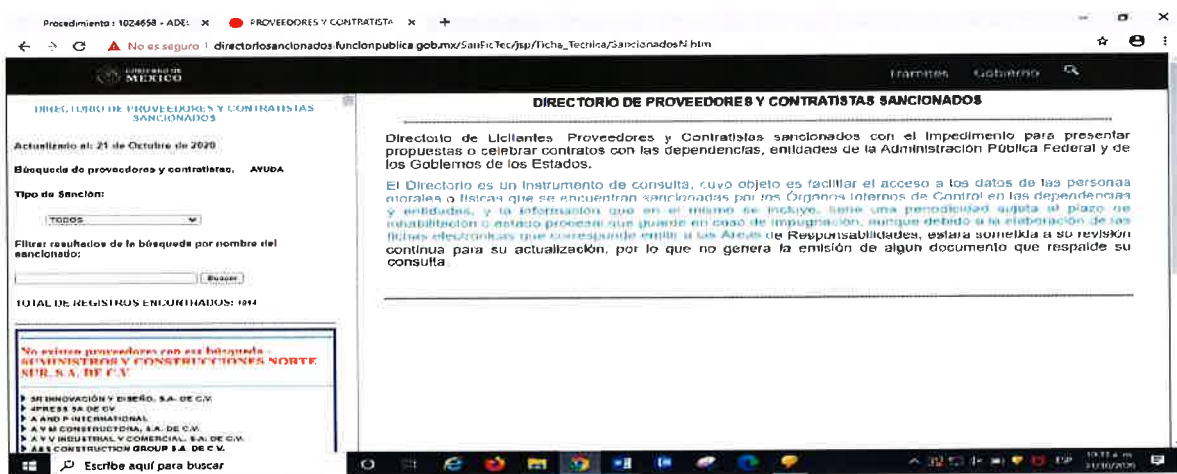

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.



Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
LEONORA VICARIO
Presidencia Municipal de Lázaro Cárdenas



Procedimiento: 1024658 - ADEU x +

compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=OFFERS_OVERVIEW_ACTIVE

11:20 a. m. CST - Central America Time DST

Be: Juan Carlos Reyes Villagomez

CompraNet

Procedimiento: 1024658 - ADECUACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUMIAL EN LA ZONA DE PATIOS DE ALMACENAMIENTO DE LA ISLA DEL CAYACAL EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHI.

Expediente: 2169995 - ADECUACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUMIAL EN LA ZONA DE PATIOS DE ALMACENAMIENTO

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 21/10/2020 10:00:00 a. m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Apertura de proposiciones | Fallo | Objeciones | Mensajes de los Compadres | Licitantes

Resumen de Respuestas | Propuestas Técnicas | Propuestas Económicas | Estados de la apertura de Propuestas

Respuestas para Evaluar

SE	Licitante	PDF Firmado Finalizado	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	México de Récord (m)	Resumen de la oferta
1	ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL S.A. DE C.V.	TE	15/10/2020 01:29:52 p. m.		
2	CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL	TE	20/10/2020 11:22:27 p. m.		
3	CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACÁN S.A. DE C.V.	TE	17/10/2020 06:25:57 a. m.		
4	CONSTRUCTORA VELMAR S.A. DE C.V.	TE	21/10/2020 01:19:11 a. m.		
5	CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA S.A. DE C.V.	TE	21/10/2020 04:48:43 a. m.		
6	COPEVE PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V.	TE	20/10/2020 06:11:13 p. m.		
7	CRIDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TE	20/10/2020 08:01:44 p. m.		
8	EMPOPO YAHUQUARDIA CIVIL S.A. DE C.V.	TE	21/10/2020 06:41:45 a. m.		
9	GRUPO FIMDAM S.A. DE C.V.	TE	20/10/2020 04:22:00 p. m.		
10	GRUPO HANDELLARDO S.A. DE C.V.	TE	21/10/2020 04:27:02 a. m.		
11	INSTALACIONES TERMICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	TE	21/10/2020 06:59:59 a. m.		
12	LZO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TE	20/10/2020 20:56:29 p. m.		
13	OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	TE	21/10/2020 07:54:14 a. m.		
14	PROYECTOS DE OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	TE	21/10/2020 08:58:59 a. m.		
15	SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO PARA CONSERVACION DE CARRETERAS S.A. DE C.V.	TE	21/10/2020 20:30:25 a. m.		
16	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR S.A. DE C.V.	TE	20/10/2020 09:30:04 p. m.		
Total: 16					

Página 1 de 1

A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los precios propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE:

PRECIO PROPUESTO (\$)

- ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.
- CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL, S.A. DE C.V.

\$ 4,467,409.63

\$ 3,632,220.69

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx



2020
LEONA VICARIO
GOBIERNO DEL ESTADO DE LA PINTURA



3. CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	\$ 3,858,717.49
4. CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.	\$ 3,990,187.67
5. CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.	\$ 6,430,466.14
6. CORVE PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 4,372,306.51
7. CRICE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 3,171,191.49
8. EMPORIO VANGUARDIA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$ 3,306,384.39
9. GRUPO FMMDAM, S.A. DE C.V.	\$ 3,682,410.90
10. GRUPO INMOBILIARIO FACE, S.A. DE C.V.	\$ 4,043,163.75
11. INSTALACIONES TERMICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	\$ 4,664,646.41
12. LZC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 3,444,369.58
13. OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$ 3,554,863.51
14. PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$ 4,402,821.53
15. SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$ 4,257,750.92
16. SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.	\$ 5,597,622.81

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **11:00 horas**, del día **04 de noviembre de 2020**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 12:20 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.





POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN

ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ

ING. RICARDO SÁNCHEZ CORTÉS

POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC

El Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, asiste al presente acto de recepción y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

ASISTE POR MEDIOS ELECTRONICOS

C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

ING. MARIO BENÍTEZ MARTÍNEZ

NOMBRE DEL LICITANTE:

1. ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.
2. CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
3. CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
4. CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.
5. CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET



2020
LEONORA VICARIO
SENTEZAMTA MENDIPE DUELA PATRIA



6. CORVE PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
7. CRICE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
8. EMPORIO VANGUARDIA CIVIL, S.A. DE C.V.
9. GRUPO FMMDAM, S.A. DE C.V.
10. GRUPO INMOBILIARIO FACE, S.A. DE C.V.
11. INSTALACIONES TERMICAS Y CONSTRUCCIONES
CIVILES, S.A. DE C.V.
12. LZC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
13. OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE
C.V.
14. PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
15. SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA
CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.
16. SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A.
DE C.V.

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 52

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1024658_price/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1024658_price/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1024658_price/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1024658_price/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/supplier.txt
5	/rfq_1024658_price/rfq.txt
6	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Anexos_Genéricos/001-ECONOMICA.rar
10	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Anexos_Genéricos/002-TECNICA.rar
11	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Anexos_Genéricos/DOCUMENTOS.rar
12	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_DD-01/001-DD_01.pdf
13	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_DD-02/002-DD_02.pdf
14	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_DD-03/003-DD_03.pdf
15	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_DD-04/004-DD_04.pdf
16	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-01/022-PE_01.pdf
17	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-02/023-PE_02.pdf
18	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-03/024-PE_03.pdf
19	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-04/025-PE_04.pdf
20	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-05/026-PE_05.pdf
21	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-06/027-PE_06.pdf
22	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-07/028-PE_07.pdf
23	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-08/029-PE_08.pdf
24	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-09/030-PE_09.pdf
25	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-10/031-PE_10.pdf
26	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-11/032-PE_11.pdf
27	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-12/033-PE_12.pdf
28	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-13/034-PE_13.pdf
29	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-14/035-PE_14.pdf
30	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-15/036-PE_15.pdf
31	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-16/037-PE_16.pdf
32	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-17/038-PE_17.pdf
33	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PE-18/039-PE_18.pdf
34	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-01/005-PT_01.pdf
35	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-02/006-PT_02.pdf
36	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-03/007-PT_03.pdf
37	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-04/008-PT_04.pdf
38	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-05/009-PT_05.pdf
39	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-06/010-PT_06.pdf
40	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-07/011-PT_07.pdf
41	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-08/012-PT_08.pdf
42	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-09/013-PT_09.pdf
43	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-10/014-PT_10.pdf
44	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-11/015-PT_11.pdf
45	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-12/016-PT_12.pdf
46	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-13/017-PT_13.pdf
47	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-14/018-PT_14.pdf
48	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-15/019-PT_15.pdf
49	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-16/020-PT_16.pdf
50	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/Documento_PT-17/021-PT_17.pdf
51	/rfq_1024658_tech/GRUPO_FMMDAM_SA_DE-77370/supplier.txt
52	/rfq_1024658_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1024658_price/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1024658_price/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1024658_price/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1024658_price/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/supplier.txt
5	/rfq_1024658_price/rfq.txt
6	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
11	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-01/022-PE-01_CARTA_COMPROMISO.pdf
14	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-02/023-PE-02.zip
15	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-03/024-PE-03.zip
16	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-04/025-PE-04_LISTADO_DE_MANO_DE_OBRA.pdf
17	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-05/026-PE-05_LISTADO_DE_MQUINARIA.pdf
18	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-06/027-PE-06.zip
19	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-07/028-PE-07_COSTO_HORARIO_EQUIPO.pdf
20	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-08/029-PE-08_INDIRECTOS.pdf
21	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-09/030-PE-09.zip
22	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-10/031-PE-10_UTILIDAD.pdf
23	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-11/032-PE-11_CARGOS_ADICIONALES.pdf
24	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-12/033-PE-12.zip
25	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-13/034-PE-13.zip
26	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-14/035-PE-14.zip
27	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-15/036-PE-15.zip
28	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-16/037-PE-16.zip
29	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-17/038-PE-17.zip
30	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-18/039-PE-18.zip
31	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
32	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
33	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
34	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
35	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
37	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
38	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
39	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
45	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
46	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
47	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/supplier.txt
49	/rfq_1024658_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 52

Nombre del Archivo
1 /rfq_1024658_price/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 /rfq_1024658_price/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1024658_price/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4 /rfq_1024658_price/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Anexos_Genéricos/001-PE.rar
5 /rfq_1024658_price/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Anexos_Genéricos/002-PT.rar
6 /rfq_1024658_price/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Anexos_Genéricos/DA.rar
7 /rfq_1024658_price/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/supplier.txt
8 /rfq_1024658_price/rfq.txt
9 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
10 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
11 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
12 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_DD-01/001-DD-01_Intérés_en_participar.pdf
13 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_DD-02/002-DD-02_Facultades_suficientes.pdf
14 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_DD-03/003-DD-03_Convenio_de_proposición_conjunta.pdf
15 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_DD-04/004-DD-04_Anexo_uno_y_dos.pdf
16 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-01/022-PE_01_Carta_proposición.pdf
17 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-02/023-PE_02_01_ANALISIS_DE_PU.pdf
18 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-03/024-PE_03_LISTADO_DE MATERIALES.pdf
19 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-04/025-PE_04_LISTADO MANO DE OBRA.pdf
20 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-05/026-PE_05_LISTADO DE MAQUINARIA.pdf
21 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-06/027-PE_06_FACTOR DE SALARIO REAL.pdf
22 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-07/028-PE_07_ANALISIS DE CH.pdf
23 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-08/029-PE_08_ANALISIS DEL FACTOR DE INDIRECTOS.pdf
24 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-09/030-PE_09_ANALISIS DEL FACTOR DE FINANCIAMIENTO.pdf
25 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-10/031-PE_10_ANALISIS DEL FACTOR DE UTILIDAD.pdf
26 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-11/032-PE_11_CARGOS ADICIONALES.pdf
27 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-12/033-PE_12 DATOS BASICOS DE MATERIALES.pdf
28 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-13/034-PE_13 CATALOGO DE CONCEPTOS.pdf
29 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-14/035-PE_14 PROGRAMA EJECUCION.pdf
30 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-15/036-PE_15 PROGRAMA MATERIALES.pdf
31 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-16/037-PE_16 PROGRAMA MANO DE OBRA.pdf
32 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-17/038-PE_17 PROGRAMA MAQUINARIA.pdf
33 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PE-18/039-PE_18 PROGRAMA PERSONAL TÉCNICO ADMON.pdf
34 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-01/005-PT-01_Conocer_el_sitio_de_los_trabajos.pdf
35 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-02/006-PT-02_Planeación_y_procedimiento_constructivo.pdf
36 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-03/007-PT-03_Capacidad_técnica_y_experiencia_personal.pdf
37 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-04/008-PT-04_Experiencia_de_la_empresa.pdf
38 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-05/009-PT-05_Conocer_los_protectos_arq.pdf
39 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-06/010-PT-06_Trabajos_a_subcontratar.pdf
40 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-07/011-PT-07_Capacidad_financiera.pdf
41 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-08/012-PT-08_Relación_equipo_y_maquinaria.pdf
42 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-09/013-PT-09_Modelo_de_contrato.pdf
43 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-10/014-PT-10_Precios_consignados.pdf
44 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-11/015-PT-11_CMIC.pdf
45 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-12/016-PT-12_Mano_de_obra_local.pdf
46 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-13/017-PT-13_Personal_con_discapacidad.pdf
47 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-14/018-PT-14_Documento_SAT.pdf
48 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-15/019-PT-15_Documento_IMSS.pdf
49 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-16/020-PT-16_Documento_INFONAVIT.pdf
50 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/Documento_PT-17/021-PT-17_Especificaciones_generales_y_particulares.pdf
51 /rfq_1024658_tech/GRUPO_INMOBILIARIO-617348/supplier.txt
52 /rfq_1024658_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1024658_price/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1024658_price/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1024658_price/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1024658_price/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/supplier.txt
5	/rfq_1024658_price/rfq.txt
6	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-01/022-DOC_PE-01_CARTA_COMPROMISO.pdf
14	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-02/023-DOC_PE02_ANALISIS_DE_PRECIOS_UNITARIOS_Y_BASICOS.pdf
15	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-03/024-DOC_PE03_LISTADO_DE MATERIALES.pdf
16	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-04/025-DOC_PE04_LISTADO_DE MANO DE OBRA.pdf
17	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-05/026-DOC_PE05_LISTADO_DE MAQUINARIA.pdf
18	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-06/027-DOC_PE06_CALCULO_DE SALARIOS Y FACTOR DE RIESGO.pdf
19	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-07/028-DOC_PE07_COSTOS HORARIOS.pdf
20	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-08/029-DOC_PE08_INDIRECTO.pdf
21	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-09/030-DOC_PE09_FINANCIAMIENTO.pdf
22	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-10/031-DOC_PE10_UTILIDAD.pdf
23	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-11/032-DOC_PE11_CARGOS ADICIONALES.pdf
24	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-12/033-DOC_PE12_RELACION DE MATERIALES.pdf
25	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-13/034-DOC_PE-13_CATALOGO DE CONCEPTOS.pdf
26	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-14/035-DOC_PE-14_PROGRAME DE OBRA.pdf
27	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-15/036-DOC_PE15_PROGRAMA DE MATERIALES.pdf
28	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-16/037-DOC_PE16_PROGRAMA DE MANO DE OBRA.pdf
29	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-17/038-DOC_PE17_PROGRAMA DE MAQUINARIA.pdf
30	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PE-18/039-DOC_PE18_D_PROGRAMA_PERSONAL INDIRECTOS.pdf
31	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1024658_tech/EMPORIO_VANGUARDIA-556236/supplier.txt
49	/rfq_1024658_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1024658_price/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1024658_price/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1024658_price/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1024658_price/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/supplier.txt
5	/rfq_1024658_price/rfq.txt
6	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
10	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
11	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_DD-03/003-DD-03.zip
12	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_DD-04/004-DD-04.zip
13	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01.zip
14	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02.zip
15	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03.zip
16	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-04/025-PE_04_EXPLOSION_MANO_DE_OBRA_Y_HERRAMIENTA.zip
17	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-05/026-PE5_EXPLOSION_MAQUINARIA.zip
18	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06.zip
19	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-07/028-PE7_COSTO_HORARIO.zip
20	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08.zip
21	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09.zip
22	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-10/031-PE10.zip
23	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-11/032-PE11_CARGOS_ADICIONALES.zip
24	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12.zip
25	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-13/034-PE-13_CATALOGO.zip
26	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-14/035-PE14_PROGRAMA.zip
27	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE15_PROGRAMA_MATERIALES.zip
28	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16.zip
29	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17.zip
30	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18.zip
31	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.zip
32	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
33	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
34	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.zip
35	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
36	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.zip
37	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
38	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.zip
39	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09_22.zip
40	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.zip
41	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.zip
42	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.zip
43	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.zip
44	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.zip
45	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.zip
46	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.zip
47	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.zip
48	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/supplier.txt
49	/rfq_1024658_tech/rfq.txt




Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1024658_price/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1024658_price/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1024658_price/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1024658_price/ASESORIA_SUPERVISI-8455/supplier.txt
5	/rfq_1024658_price/rfq.txt
6	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
14	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
15	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
16	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
17	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
18	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
19	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
20	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
21	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-09/330-PE-09.pdf
22	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
23	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
24	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
25	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
26	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
27	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
28	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
29	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
30	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
31	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1024658_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/supplier.txt
49	/rfq_1024658_tech/rfq.txt

Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1024658_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1024658_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1024658_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1024658_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/supplier.txt
5	/rfq_1024658_price/rfq.txt
6	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
14	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
15	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
16	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
17	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
18	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
19	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
20	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
21	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
22	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
23	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
24	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
25	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
26	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
27	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
28	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
29	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
30	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
31	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-06/010-pt-06.pdf
37	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1024658_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/supplier.txt
49	/rfq_1024658_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 51

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1024658_price/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1024658_price/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1024658_price/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1024658_price/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/supplier.txt
5	/rfq_1024658_price/rfq.txt
6	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Genéricos/001-PE_13_CATALOGO_DE_CONCEPTOS.xlsx
10	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Genéricos/PE_02_PUS.xlsx
11	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
12	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
13	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
14	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
15	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
16	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
17	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
18	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
19	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
20	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
21	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
22	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
23	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
24	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
25	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
26	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
27	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
28	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
29	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
30	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
31	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
32	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
33	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
34	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
35	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
36	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
37	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
38	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
39	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
40	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
41	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
42	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
43	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
44	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
45	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
46	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
47	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
48	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
49	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
50	/rfq_1024658_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/supplier.txt
51	/rfq_1024658_tech/rfq.txt


Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1024658_price/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1024658_price/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1024658_price/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1024658_price/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/supplier.txt
5	/rfq_1024658_price/rfq.txt
6	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_DD-01/001-DD-01_INTERES_EN_PARTICIPAR.pdf
10	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
11	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_DD-03/003-DD-03_CONVENIO_DE_PARTICIPACION_CONJUNTA.pdf
12	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_DD-04/004-DD-4_NOTA_INFORMATIVA.pdf
13	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PE-01/022-PE-01_CARTA_COMPROMISO.pdf
14	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PE-02/023-PE-02_ANALISIS_DE_PRECIOS.zip
15	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PE-03/024-PE-03_RELACION_DE_MATERIALES.pdf
16	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PE-04/025-PE-4_RELACION_DE_MANO_DE_OBRA.pdf
17	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PE-05/026-PE-05_MQUINARIA_Y_EQUIPO.pdf
18	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PE-06/027-PE-06_FACTOR_DE_SALARIO.pdf
19	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PE-07/028-PE-07_COSTOS_HORARIOS.pdf
20	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PE-08/029-PE-08_COSTOS_INDIRECTOS.pdf
21	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PE-09/030-PE-09_FINANCIAMIENTO.pdf
22	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PE-10/031-PE-10_UTILIDAD.pdf
23	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PE-11/032-PE-11_CARGOS_ADICIONALES.pdf
24	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PE-12/033-PE-12_RELACION_Y_ANALISIS_DE_MATERIALES.pdf
25	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PE-13/034-PE-13_CATALOGO_DE_CONCEPTOS.zip
26	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PE-14/035-PE-14_PROGRAMA_DE_EJECUCION_GENERAL.pdf
27	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PE-15/036-PE-15_PROGRAMA_DE_MATERIALES.pdf
28	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PE-16/037-PE-16_PROGRAMA_DE_MANO_DE_OBRA.pdf
29	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PE-17/038-PE-17_PROGRAMA_MQUINARIA_Y_EQUIPO.pdf
30	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PE-18/039-PE-18_PROGRAMA_PERSONAL TECNICO.pdf
31	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PT-01/005-PT-01_MANIFESTACION_DE_CONOCER_EL_SITIO.pdf
32	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PT-02/006-PT-02_PLANEACION_INTEGRAL.pdf
33	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PT-03/007-PT-03_CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA PERSONAL.zip
34	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PT-04/008-PT-04_EXPERIENCIA TECNICA.zip
35	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PT-05/009-PT-05_CONOCER_EL_PROYECTO.zip
36	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PT-06/010-PT-06_NO_SUBCONTRATACION.pdf
37	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PT-07/011-PT-07_CAPACIDAD FINANCIERA.zip
38	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PT-08/012-PT-08_RELACION_DE_MQUINARIA.pdf
39	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PT-09/013-PT-09_MODELO_DE CONTRATO.pdf
40	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PT-10/014-PT-10_CONSIGNACION_DE_PRECIOS.pdf
41	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PT-11/015-PT-11_NO_AFILIACION_A_LA_CMIC.pdf
42	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PT-12/016-PT-12_PORCENTAJE_DE_MANO_DE_OBRA.pdf
43	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PT-13/017-PT-13_PERSONAL_CON_DISCAPACIDAD.pdf
44	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PT-14/018-PT-14_ARTICULO_32-D.pdf
45	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PT-15/019-PT-15_OPINION_DE_CUMPLIMIENTO_IMSS.pdf
46	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PT-16/020-PT-16_OPINION_INFONAVIT.pdf
47	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/Documento_PT-17/021-PT-17_ESPECIFICACIONES.zip
48	/rfq_1024658_tech/CORVE_PROYECTOS_Y_D-64318/supplier.txt
49	/rfq_1024658_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1024658_price/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1024658_price/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1024658_price/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1024658_price/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/supplier.txt
5	/rfq_1024658_price/rfq.txt
6	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
11	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_DD-04/004-DD04.pdf
13	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-01/022-PE_01.pdf
14	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-02/023-PE_02.pdf
15	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-03/024-PE_03.pdf
16	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-04/025-PE_04.pdf
17	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-05/026-PE_05.pdf
18	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-06/027-PE_06.pdf
19	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-07/028-PE_07.pdf
20	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-08/029-PE_08.pdf
21	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-09/030-PE_09.pdf
22	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-10/031-PE_10.pdf
23	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-11/032-PE_11.pdf
24	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-12/033-PE_12.pdf
25	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-13/034-PE_13.pdf
26	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-14/035-PE_14.pdf
27	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-15/036-PE_15.pdf
28	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-16/037-PE_16.pdf
29	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-17/038-PE_17.pdf
30	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PE-18/039-PE_18.pdf
31	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-01/005-PT_01.pdf
32	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-02/006-PT_02.pdf
33	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-03/007-PT03.zip
34	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-04/008-PT_04.zip
35	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-05/009-PT05.zip
36	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-06/010-PT_06.pdf
37	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-07/011-PT_07.zip
38	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-08/012-PT_08.pdf
39	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-09/013-PT_09.pdf
40	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-10/014-PT_10.pdf
41	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-11/015-PT_11.pdf
42	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-12/016-PT_12.pdf
43	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-13/017-PT_13.pdf
44	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-14/018-PT_14.pdf
45	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-15/019-PT_15.pdf
46	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-16/020-PT_16.pdf
47	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/Documento_PT-17/021-PT_17.pdf
48	/rfq_1024658_tech/CRICE_CONSTRUCCIONE-5770/supplier.txt
49	/rfq_1024658_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

1	/rfq_1024658_price/INSTALACIONES_TERM-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf
2	/rfq_1024658_price/INSTALACIONES_TERM-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf_rpt.pdf
3	/rfq_1024658_price/INSTALACIONES_TERM-703049/supplier.txt
4	/rfq_1024658_price/rfq.txt
5	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
6	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_rpt.pdf
7	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_DD-01/001-DD-01_MANIFESTACION_DE_INTERES_EN_PARTICIPAR.pdf
8	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_DD-02/002-DD-02_MANIFESTACION_CUENTA_CON_FACULTADES_PARA_COMPROMETERSE.pdf
9	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_DD-03/003-DD-03_CONVENIO_PROPOSICION_CONJUNTA.pdf
10	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_DD-04/004-DD-04_ANEXO_UNO_Y_DOS DOS REGLAMENTO DE CONTROL AMBIENTAL.pdf
11	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PE-01/022-PE_01_- Carta compromiso de la proposicion firmada.pdf
12	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PE-02/023-PE_02_- Analisis de precios unitarios.pdf
13	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PE-03/024-PE_03_- Listado de insumos de materiales.pdf
14	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PE-04/025-PE_04_- Listado de insumos de mano de obra.pdf
15	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PE-05/026-PE_05_- Listado de insumos de maquinaria y equipo de construccion.pdf
16	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PE-06/027-PE_06_- Tabulador de salarios.pdf
17	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PE-07/028-PE_07_- Costos horarios de la maquinaria.pdf
18	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PE-08/029-PE_08_- Costos indirectos de oficina y de campo.pdf
19	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PE-09/030-PE_09_- Calculo de cargo del financiamiento.pdf
20	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PE-10/031-PE_10_- Calculo de cargo por utilidad.pdf
21	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PE-11/032-PE_11_- Calculo de cargos adicionales.pdf
22	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PE-12/033-PE_12_- Relacion y analisis de costos de materiales.pdf
23	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PE-13/034-PE_13_- Catalogo de conceptos.pdf
24	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PE-14/035-PE_14_- Programa de ejecucion general de obra.pdf
25	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PE-15/036-PE_15_- Programa de erogaciones de materiales.pdf
26	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PE-16/037-PE_16_- Programa de erogaciones de mano de obra.pdf
27	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PE-17/038-PE_17_- Programa de erogaciones de equipo y maquinaria.pdf
28	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PE-18/039-PE_18_- Programa de erogaciones de personal de indirectos.pdf
29	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PT-01/005-PT_01_- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que conoce el sitio donde se efectuaran los trabajos.pdf
30	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PT-02/006-PT_02_- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.pdf
31	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PT-03/007-P_03_- Capacidad tecnica y experiencia del personal profesional.pdf
32	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PT-04/008-PT_04_- Experiencia y capacidad tecnica de la empresa.rar
33	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PT-05/009-PT_05_- Manifestación de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería.pdf
34	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PT-06/010-PT_06_- Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará.pdf
35	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PT-07/011-PT_07_- Capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados.pdf
36	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PT-08/012-PT_08_- Relación de maquinaria y equipo de construcción.pdf
37	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PT-09/013-PT_09_- Modelo de contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado al cual se sujetará la ejecución de los trabajos.pdf
38	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PT-10/014-PT_10_- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposición.pdf
39	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PT-11/015-PT_11_- Manifiesto conocer y estar conforme con el Convenio de Colaboración.pdf
40	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PT-12/016-PT_12_- Manifiesto del porcentaje mínimo de mano de local que los licitantes deberán incorporar en las obras a realizarse.pdf
41	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PT-13/017-PT_13_- Manifiesto que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad.pdf
42	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PT-14/018-PT_14_- Documento actualizado expedido por el SAT.pdf
43	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PT-15/019-PT_15_- Documento actualizado expedido por el IMSS.pdf
44	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PT-16/020-PT_16_- Documento actualizado expedido por el INFONAVIT.pdf
45	/rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/Documento_PT-17/021-PT_17_- Manifestación escrita de conocer y estar conforme con los terminos de referencia.pdf

46 /rfq_1024658_tech/INSTALACIONES_TERM-703049/supplier.txt

47 /rfq_1024658_tech/rfq.txt


[Handwritten signature] ✓ *[Handwritten signature]* ✓ *[Handwritten signature]*

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1024658_price/rfq.txt
2	/rfq_1024658_price/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1024658_price/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1024658_price/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1024658_price/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/supplier.txt
6	/rfq_1024658_tech/rfq.txt
7	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_DD-01/001-DD1.pdf
11	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_DD-02/002-DD2.pdf
12	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_DD-03/003-DD3.pdf
13	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_DD-04/004-DD4.pdf
14	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-01/022-PE_01.pdf
15	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-02/023-PE_02.pdf
16	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-03/024-PE_03.pdf
17	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-04/025-PE_04.pdf
18	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-05/026-PE_05.pdf
19	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-06/027-PE_06.pdf
20	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-07/028-PE_07.pdf
21	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-08/029-PE_08.pdf
22	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-09/030-PE_09.pdf
23	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-10/031-PE_10.pdf
24	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-11/032-PE_11.pdf
25	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-12/033-PE_12.pdf
26	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-13/034-LPN-09178002-022-20_Catalogo_de_conceptos.xlsx
27	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-14/035-PE_14.pdf
28	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-15/036-PE_15.pdf
29	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-16/037-PE_16.pdf
30	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-17/038-PE_17.pdf
31	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PE-18/039-PE_18.pdf
32	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-01/005-PT_01.pdf
33	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-02/006-PT_02.pdf
34	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-03/007-PT_03.pdf
35	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-04/008-PT_04.pdf
36	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-05/009-PT_05.pdf
37	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-06/010-PT_06.pdf
38	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-07/011-PT_07.pdf
39	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-08/012-PT_08.pdf
40	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-09/013-PT_09.pdf
41	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-10/014-PT_10.pdf
42	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-11/015-PT_11.pdf
43	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-12/016-PT_12.pdf
44	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-13/017-PT_13.pdf
45	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-14/018-PT_14.pdf
46	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-15/019-PT_15.pdf
47	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-16/020-PT_16.pdf
48	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/Documento_PT-17/021-PT_17.pdf
49	/rfq_1024658_tech/SUMINISTROS_Y_CONST-6785/supplier.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1024658_price/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1024658_price/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1024658_price/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1024658_price/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/supplier.txt
5	/rfq_1024658_price/rfq.txt
6	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
11	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-01/022-PE_01_CARTA_PROPOSICION.pdf
14	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-02/023-PE_02_ANALISIS_DE_PU.pdf
15	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-03/024-PE_03.zip
16	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-04/025-PE_04_LISTADO_DE INSUMOS DE MANO DE OBRA.pdf
17	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-05/026-PE_05_LISTA DE INSUMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO.pdf
18	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-06/027-PE_06.zip
19	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-07/028-PE_07_COSTO_HORARIO DE EQUIPO.pdf
20	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-08/029-PE_08.zip
21	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-09/030-PE_09.zip
22	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-10/031-PE_10_UTILIDAD.pdf
23	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-11/032-PE_11_CARGOS_ADICIONALES.pdf
24	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-12/033-PE_12.zip
25	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-13/034-PE_13.zip
26	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-14/035-PE_14.zip
27	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-15/036-PE_15.zip
28	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-16/037-PE_16.zip
29	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-17/038-PE_17.zip
30	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-18/039-PE_18.zip
31	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
32	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
33	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
34	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
35	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
37	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
38	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
45	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
46	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
47	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
48	/rfq_1024658_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/supplier.txt
49	/rfq_1024658_tech/rfq.txt




Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 48

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1024658_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary_(2).pdf.p7m
2	/rfq_1024658_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary_(2).pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1024658_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/supplier.txt
4	/rfq_1024658_price/rfq.txt
5	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary_(2).pdf.p7m
6	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary_(2).pdf.p7m_rpt.pdf
7	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Genericos/PE_13_CATALOGO_DE_CONCEPTOS.xlsx
8	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
9	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
10	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-03/003-DD-03.zip
11	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-04/004-DD-04.zip
12	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-01/022-PE-01.zip
13	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-02/023-PE-02.zip
14	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-03/024-PE-03.zip
15	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-04/025-PE-04.zip
16	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-05/026-PE-05.zip
17	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-06/027-PE-06.zip
18	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-07/028-PE-07.zip
19	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-08/029-PE-08.zip
20	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-09/030-PE-09.zip
21	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-10/031-PE-10.zip
22	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-11/032-PE-11.zip
23	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-12/033-PE-12.zip
24	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-13/034-PE-13.zip
25	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-14/035-PE-14.zip
26	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-15/036-PE-15.zip
27	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-16/037-PE-16.zip
28	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-17/038-PE-17.zip
29	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-18/039-PE-18.zip
30	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
31	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
32	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
33	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
34	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
35	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
36	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
37	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
38	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
39	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
40	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
41	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
42	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
43	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
44	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
45	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
46	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
47	/rfq_1024658_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/supplier.txt
48	/rfq_1024658_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 50

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1024658_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1024658_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1024658_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1024658_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/supplier.txt
5	/rfq_1024658_price/rfq.txt
6	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Genéricos/PE.ZIPrar
10	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
11	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
12	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
13	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
14	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
15	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
16	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
17	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
18	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
19	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
20	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
21	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
22	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
23	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
24	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
25	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
26	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
27	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
28	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
29	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
30	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
31	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
32	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
33	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
34	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-03/007-PT-03_REV_01.pdf
35	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-04/008-PT-04_REV_01.pdf
36	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
37	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
38	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
39	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
40	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
41	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
42	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
43	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
44	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
45	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
46	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
47	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
48	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
49	/rfq_1024658_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/supplier.txt
50	/rfq_1024658_tech/rfq.txt

 7  7 



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1024658_price/rfq.txt
2	/rfq_1024658_price/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1024658_price/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1024658_price/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1024658_price/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/supplier.txt
6	/rfq_1024658_tech/rfq.txt
7	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
11	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-02/002-DD-2.zip
12	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-03/003-DD-3.zip
13	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-04/004-DD-4.zip
14	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-01/022-PE-01.zip
15	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-02/023-PE-02.zip
16	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-03/024-PE-03.zip
17	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-04/025-PE-04.zip
18	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-05/026-PE-05.zip
19	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-06/027-PE-06.zip
20	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-07/028-PE-07.zip
21	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-08/029-PE-08.zip
22	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-09/030-PE-09.zip
23	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-10/031-PE-10.zip
24	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-11/032-PE-11.zip
25	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-12/033-PE-12.zip
26	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-13/034-PE-13.zip
27	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-14/035-PE-14.zip
28	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-15/036-PE-15.zip
29	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-16/037-PE-16.zip
30	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-17/038-PE-17.zip
31	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-18/039-PE-18.zip
32	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
33	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
34	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
35	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
36	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
37	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
38	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
39	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
40	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
41	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
42	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
43	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
44	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
45	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
46	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
47	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
48	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
49	/rfq_1024658_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/supplier.txt

