ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ASIPONA-IO-GI-10-22-13,** RELATIVA A LOS TRABAJOS DE **"RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA SALIDA DE CARGA DE CABOTAJE, CON LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LIBRAMIENTO DE CONEXIÓN CON EL PUERTO LÁZARO CÁRDENAS, MICH. A PARTIR DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 3+300.00".**

En la ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 13:00 horas del día 28 de octubre del año 2022, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el Arq. Manuel Arce Rodea, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-044-22, de fecha 26 de enero de 2022, actuando en nombre y representación de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accesó a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **03 (tres) propuestas** de los siguientes licitantes:

- MB DESARROLLOS INTEGRALES, S.C.
- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TORZAT, S.A.
- SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

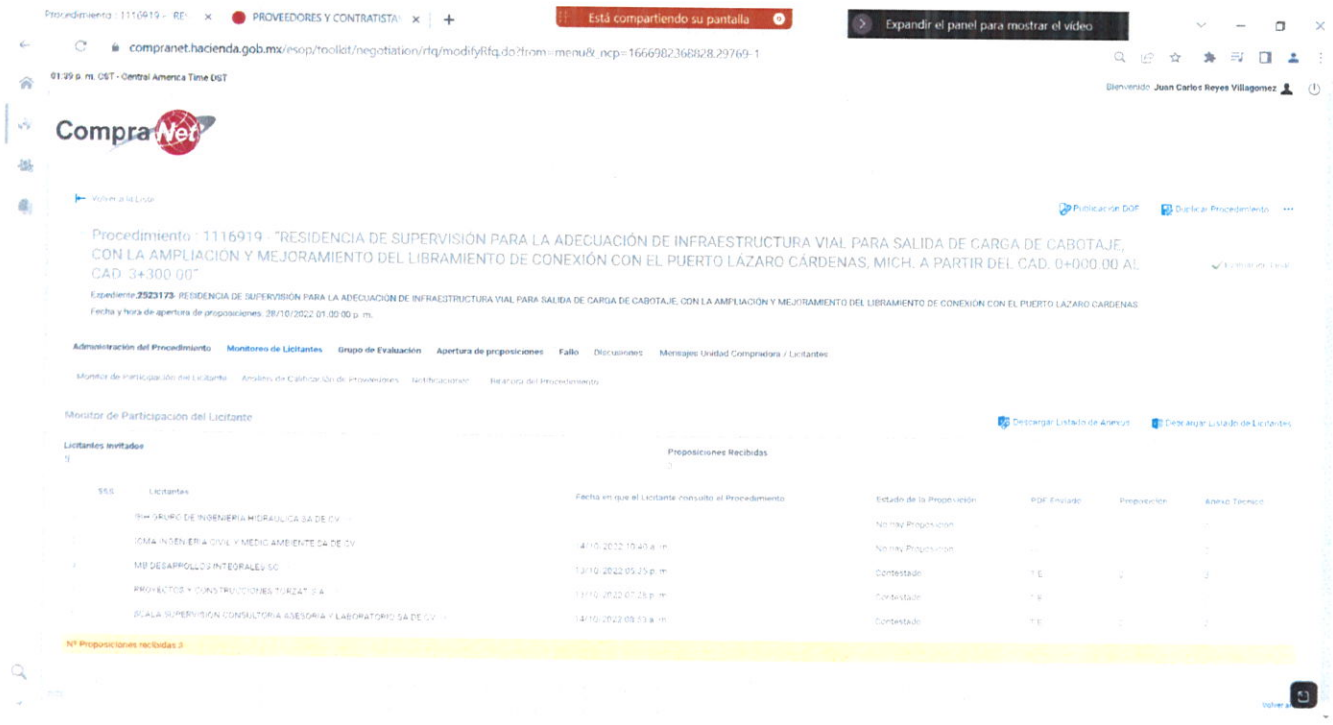

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas y/o inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.




Está compartiendo su pantalla
Expandir el panel para mostrar el video
directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm
GOBIERNO DE MÉXICO
Trámites
Gobierno
DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS
Actualizado al: 28 de Octubre de 2022
Busqueda de proveedores y contratistas. AYUDA
Tipo de Sanción:
TODOS
Filtrar resultados de la busqueda por nombre del sancionado:
Buscar
TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2157
No existen proveedores con esa búsqueda - SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV
128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
4PRESS SA DE CV
A AND P INTERNATIONAL
A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
A.D.C. Consultores y Servicios, S.A de C.V.
AARON VERA MORALES
AARON VERA MORALES
ABAMCU, S.A. DE C.V.
ABASERCOM, S.A. DE C.V.
DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS
Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.
El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.


Está compartiendo su pantalla
Expandir el panel para mostrar el video
directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm
GOBIERNO DE MÉXICO
Trámites
Gobierno
DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS
Actualizado al: 28 de Octubre de 2022
Busqueda de proveedores y contratistas. AYUDA
Tipo de Sanción:
SELECCIONE UNA OPCIÓN
Filtrar resultados de la busqueda por nombre del sancionado:
Buscar
TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2157
No existen proveedores con esa búsqueda - MB DESARROLLOS INTEGRALES SC
128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
4PRESS SA DE CV
A AND P INTERNATIONAL
A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
A.D.C. Consultores y Servicios, S.A de C.V.
AARON VERA MORALES
AARON VERA MORALES
ABAMCU, S.A. DE C.V.
ABASERCOM, S.A. DE C.V.
ABASERCOM, S.A. DE C.V.
DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS
Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.
El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionado o inhabilitado, aceptándose las **03 (tres) propuestas** para su REVISIÓN DETALLADA.



Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.



A continuación, se presentan el nombre del licitante y el monto propuesto:

NOMBRE DEL LICITANTE:	MONTO PROPUESTO ($)
1. MB DESARROLLOS INTEGRALES, S.C.	**$7,386,052.30**
2. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TORZAT, S.A.	**$8,306,059.20**
3. SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	**$7,183,867.30**

A efecto de que la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **18:00 horas**, del día **11 de noviembre de 2022**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 13:50 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

ARQ. MANUEL ARCE RODEA
GERENTE DE INGENIERIA

ARQ. YARITZA SALVATIERRA GUTIÉRREZ
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN

ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ
SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS.

El Órgano Interno de Control en la ASIPONA LAZARO CARDENAS, asiste al presente acto de presentación y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

QUIEN PARTICIPA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN

ING. FERNANDO RODRÍGUEZ ROCHA

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

ARQ. JESUS ABRAHAM OCHOA VIDRIO

NOMBRE DEL LICITANTE:	NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA
MB DESARROLLOS INTEGRALES, S.C.	COMPRANET
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TORZAT, S.A.	COMPRANET
SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	COMPRANET

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 50

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

1 /rfq_1116919_price/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Firmados_Digitalmente/***001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m***
2 /rfq_1116919_price/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Firmados_Digitalmente/***002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf***
3 /rfq_1116919_price/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Firmados_Digitalmente/***003-PriceEnvelopeSummary.pdf***
4 /rfq_1116919_price/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/***supplier.txt***
5 /rfq_1116919_price/***rfq.txt***
6 /rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Firmados_Digitalmente/***038-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m***
7 /rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Firmados_Digitalmente/***039-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf***
8 /rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Firmados_Digitalmente/***040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf***
9 /rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Genéricos/***001-PE.zip***
10/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Genéricos/***002-PT.zip***
11/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Genéricos/***DD.zip***
12/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_DD-01/***001-Documento_DD-01_Manifestación_escrita_de_interés_en_participar_en_la***
13/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_DD-02/***002-Documento_DD-02_Manifestación_que_cuenta_con_las_facultades_para_comprometerse.pdf***
14/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_DD-03/***003-Documento_DD-03_Convenio_de_participación_conjunta.pdf***
15/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_DD-04/***004-Documento_DD-04_Anexos.pdf***
16/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-01/***020-PE_01_CARTA_COMPROMISO_DE_LA_PROPOSICIÓN.pdf***
17/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-02/***021-PE_02_ANÁLISIS_DEL_TOTAL_DE_LOS_PRECIOS_UNITARIOS.zip***
18/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-03/***022-PE_03_LISTADO_DE_INSUMOS_QUE_INTERVIENEN_EN_LA_INTEGRACION_DE_LA_PROP_MAT_Y_EQ_PERMANENTE.pdf***
19/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-04/***023-PE_04_LISTADO_DE_INSUMOS_QUE_INTERVIENEN_EN_LA_INTEGRACION_DE_LA_PROP__MANO_DE_OBRA.pdf***
20/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-05/***024-PE_05_LISTADO_DE_INSUMOS_QUE_INTERVIENEN_EN_LA_INTEGRACION_DE_LA_PROP__MAQ._Y_EQ.pdf***
21/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-06/***025-PE_06_ANÁLISIS_DEL_FACTOR_DE_SALARIO_REAL.pdf***
22/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-07/***026-PE_07_ANÁLISIS,_CÁLCULO_E_INTEGRACIÓN_DE_LOS_COSTOS_HORARIOS_DE_LA_MAQ_Y_EQ_DE_CONSTRUCCIÓN.pdf***
23/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-08/***027-PE_08_ANÁLISIS,_CÁLCULO_E_INTEGRACIÓN_DE_LOS_COSTOS_INDIREC***
24/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-09/***028-PE_09_ANÁLISIS,_CÁLCULO_E_INTEGRACIÓN_DEL_COSTO_POR_FINANCI***
25/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-10/***029-PE_10_UTILIDAD_PROPUESTA_POR_EL_LICITANTE.pdf***
26/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-11/***030-PE_11_ANÁLISIS,_CÁLCULO_E_INTEGRACIÓN_PARA_DETERMINAR_LOS_CARGOS_ADICIONALES.pdf***
27/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-12/***031-PE_12_RELACIÓN_Y_ANÁLISIS_DE_LOS_COSTOS_UNITARIOS_BÁSICOS_DE_LOS_MATERIALES.pdf***
28/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-13/***032-PE_13_CATÁLOGO_DE_CONCEPTOS.zip***
29/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-14/***033-PE_14_PROGRAMA_DE_EJECUCIÓN_GENERAL_CONFORME_AL_CATÁLOGO_DE_CONCEPTOS.pdf***
30/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-15/***034-PE_15_PROGRAMA_DE_EROGACIONES_A_COSTO_DIRECTO_DE_LOS_MATERIALES_Y_EQUIPOS_DE_INSTALACIÓN_PERMANENTE.pdf***
31/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-16/***035-PE_16_PROGRAMA_DE_EROGACIONES_A_COSTO_DIRECTO_DE_LA_MANO_DE_OBRA.pdf***
32/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-17/***036-PE_17_PROGRAMA_DE_EROGACIONES_A_COSTO_DIRECTO_DE_LA_MAQUINARIA_Y_EQUIPO_PARA_COSNTRUCCIÓN.pdf***
33/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-18/***037-PE_18_PROGRAMA_DE_EROGACIONES_A_COSTO_DIRECTO_DE_LA_UTILIZACIÓN_DEL_PERSONAL_PROFESIONAL_TÉCNICO,_ADMINISTRATIVO_Y_DE***
34/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-01/***005-Documento_PT-01_Manifestación_escrita_de_conoce_el_sitio_de_los_trab***
35/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-02/***006-Documento_PT-02_Planeación_estratégica.pdf***
36/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-03/***007-Documento_PT-03_Capacidad_tecnica_y_experiencia_del_personal_profesional_tecnico.pdf***
37/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-04/***008-Documento_PT-04_Experiencia_y_Capacidad_Ténica_de_la_Empresa.pdf***
38/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-05/***009-Documento_PT-05_Subcontratación.pdf***
39/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-06/***010-Documento_PT-06_Capacidad_Financiera.pdf***
40/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-07/***011-Documento_PT-07_Relación_de_maquinaria_y_equipo_de_construcción.pd***
41/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-08/***012-Documento_PT-08_Modelo_de_Contrato.pdf***
42/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-09/***013-Documento_PT-09_Manifiesto_del_Porcentaje_de_mano_de_obra_local.pd***
43/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-10/***014-Documento_PT-10_Convenio_CMIC.pdf***
44/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-11/***015-Documento_PT-11_Planta_laboral_con_discapacidad.pdf***
45/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-12/***016-Documento_PT-12_Opinión_del_SAT.pdf***
46/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-13/***017-Documento_PT-13_Opinión_de_cumplimiento_IMSS.pdf***
47/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-14/***018-Documento_PT-14_Opinión_de_cumplimiento_INFONAVIT.pdf***
48/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-15/***019-Documento_PT-15_Enterado_de_las_Especificaciones_Generales.pdf***
49/rfq_1116919_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/***supplier.txt***
50/rfq_1116919_tech/***rfq.txt***

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

	Nombre del Archivo
1	/rfq_1116919_price/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Anexos_Firmados_Digitalmente/***001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m***
2	/rfq_1116919_price/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Anexos_Firmados_Digitalmente/***002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf***
3	/rfq_1116919_price/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Anexos_Firmados_Digitalmente/***003-PriceEnvelopeSummary.pdf***
4	/rfq_1116919_price/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/***supplier.txt***
5	/rfq_1116919_price/***rfq.txt***
6	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Anexos_Firmados_Digitalmente/***038-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m***
7	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Anexos_Firmados_Digitalmente/***039-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf***
8	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Anexos_Firmados_Digitalmente/***040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf***
9	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_DD-01/***001-DD-01.zip***
10	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_DD-02/***002-DD-02.zip***
11	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_DD-03/***003-DD-03_Manif-present-individual-E13.pdf***
12	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_DD-04/***004-DD-04_Manif-conocer-anexos-1_y_2-E13.pdf***
13	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PE-01/***020-PE-01_Carta-compromiso-E13.pdf***
14	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PE-02/***021-PE-02_PRECIOS_UNITARIOS_ASIPONA-10-22.pdf***
15	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PE-03/***022-PE-03_LISTADO_DE_INSUMOS_MAT._ASIPONA-10-22.pdf***
16	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PE-04/***023-PE-04_LISTADO_DE_INSUMOS_M.O._ASIPONA-10-22.pdf***
17	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PE-05/***024-PE-05_LISTADO_DE_INSUMOS_MAQ._ASIPONA-10-22.pdf***
18	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PE-06/***025-PE-06_FASAR_ASIPONA-10-22.pdf***
19	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PE-07/***026-PE-07_COSTO_HORARIO_ASIPONA-10-22.pdf***
20	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PE-08/***027-PE-08_INDIRECTOS_ASIPONA-10-22.pdf***
21	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PE-09/***028-PE-09.zip***
22	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PE-10/***029-PE-10_UTILIDAD_ASIPONA-10-22.pdf***
23	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PE-11/***030-PE-11_ADICIONALES_ASIPONA-10-22.pdf***
24	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PE-12/***031-PE-12.zip***
25	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PE-13/***032-PE-13_CATALOGO_DE_CONCEPTOS_ASIPONA-10-22.pdf***
26	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PE-14/***033-PE-14__PROG.EROG.TRABAJOS_ASIPONA-10-22.pdf***
27	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PE-15/***034-PE-15_PROG.EROG.MATERIALES_ASIPONA-10-22.pdf***
28	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PE-16/***035-PE-16_PROG.EROG.MANO_DE_OBRA_ASIPONA-10-22.pdf***
29	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PE-17/***036-PE-17_PROG.EROG.MAQ_y_EQUIPO_ASIPONA-10-22.pdf***
30	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PE-18/***037-PE-18_PROG.EROG.PERS_TECN-ADMTVO_ASIPONA-10-22.pdf***
31	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PT-01/***005-PT-01.zip***
32	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PT-02/***006-PT-02.pdf***
33	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PT-03/***007-PT-03_v2.zip***
34	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PT-04/***008-PT-04.zip***
35	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PT-05/***009-PT-05.zip***
36	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PT-06/***010-PT-06.zip***
37	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PT-07/***011-PT-07.zip***
38	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PT-08/***012-PT-08_Manif-conocer-contrato-E13.pdf***
39	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PT-09/***013-PT-09_Manif-porcentaje-MdeO-E13.pdf***
40	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PT-10/***014-PT-10_Manif-conocer-conv-colab-ICIC-E13.pdf***
41	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PT-11/***015-PT-11_Manif-personal-discap-E13.pdf***
42	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PT-12/***016-PT-12.zip***
43	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PT-13/***017-PT-13.zip***
44	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PT-14/***018-PT-14.zip***
45	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/Documento_PT-15/***019-PT-15.zip***
46	/rfq_1116919_tech/PROYECTOS_Y_CONSTRU-6079/***supplier.txt***
47	/rfq_1116919_tech/***rfq.txt***

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

	Nombre del Archivo
1	/rfq_1116919_price/***rfq.txt***
2	/rfq_1116919_price/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Anexos_Firmados_Digitalmente/***001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m***
3	/rfq_1116919_price/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Anexos_Firmados_Digitalmente/***002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf***
4	/rfq_1116919_price/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Anexos_Firmados_Digitalmente/***003-PriceEnvelopeSummary.pdf***
5	/rfq_1116919_price/SCALA_SUPERVISION_C-10704/***supplier.txt***
6	/rfq_1116919_tech/***rfq.txt***
7	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Anexos_Firmados_Digitalmente/***038-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m***
8	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Anexos_Firmados_Digitalmente/***039-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf***
9	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Anexos_Firmados_Digitalmente/***040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf***
10	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Anexos_Genéricos/***001-Exp_2.pdf***
11	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Anexos_Genéricos/***Exp_1.pdf***
12	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_DD-01/***001-DD-01.pdf***
13	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_DD-02/***002-DD-02.pdf***
14	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_DD-03/***003-DD-03.pdf***
15	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_DD-04/***004-DD-04.pdf***
16	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-01/***020-PE-01.pdf***
17	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-02/***021-PE-02.pdf***
18	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-03/***022-PE-03.pdf***
19	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-04/***023-PE-04.pdf***
20	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-05/***024-PE-05.pdf***
21	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-06/***025-PE-06.pdf***
22	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-07/***026-PE-07.pdf***
23	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-08/***027-PE-08.pdf***
24	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-09/***028-PE-09.pdf***
25	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-10/***029-PE-10.pdf***
26	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-11/***030-PE-11.pdf***
27	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-12/***031-PE-12.pdf***
28	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-13/***032-PE-13.pdf***
29	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-14/***033-PE-14.pdf***
30	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-15/***034-PE-15.pdf***
31	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-16/***035-PE-16.pdf***
32	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-17/***036-PE-17.pdf***
33	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-18/***037-PE-18.pdf***
34	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-01/***005-PT-01.pdf***
35	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-02/***006-PT-02.pdf***
36	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-03/***007-PT-03.pdf***
37	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-04/***008-PT-04.pdf***
38	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-05/***009-PT-05.pdf***
39	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-06/***010-PT-06.pdf***
40	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-07/***011-PT-07.pdf***
41	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-08/***012-PT-08.pdf***
42	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-09/***013-PT-09.pdf***
43	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-10/***014-PT-10.pdf***
44	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-11/***015-PT-11.pdf***
45	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-12/***016-PT-12.pdf***
46	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-13/***017-PT-13.pdf***
47	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-14/***018-PT-14.pdf***
48	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-15/***019-PT-15.pdf***
49	/rfq_1116919_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/***supplier.txt***
