

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 09178002-020-19**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **“REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA PROTECCIÓN MARGINAL PLAYERA Y RESTAURACIÓN EN EL EJE EXISTENTE DE LA ZONA SUR, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.”**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 16:30 horas, del día 24 de junio del año 2019, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V, sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto el Ing. Luis Sánchez y López, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número **DG-262-19**, de fecha 17 de junio de 2019, actuando en nombre y representación de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, se reciben los sobres cerrados de las propuestas presenciales que contienen las propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitantes, la empresa PROSERI CORP, S.A. de C.V. no presentan propuesta presencial en este acto, se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria; posteriormente se realizó la carga al sistema CompraNet de las propuestas presenciales; procediendo con la apertura de la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas de forma electrónica por este medio, la empresa PROSERI CORP, S.A. de C.V. no presentan propuesta por este medio electrónico.


A continuación, se enlistan los licitantes:

- **PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.**
- **CONSTRUCCIONES PEREZ Y GIL, S.A. DE C.V.**
- **INFRAESTRUCTURA MONARCA, S.A. DE C.V.**
- **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.**
- **ARDICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**
- **CONSTRUCCIONES LORO´S, S.A. DE C.V.**
- **CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA TRITURADOS MIRALEJOS, S.A. DE C.V**

- **CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.**
- **IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V.**
- **INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA Y PORTUARIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA, DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y CON LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.**
- **OBRA CIVIL, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.**
- **OBRAS MARÍTIMAS HB, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA CONSORCIO CONSTRUCTOR DE OBRAS MARINAS HB, S.A. DE C.V. Y CON LA EMPRESA ADMINISTRACIÓN DE VALORES HB, S.A. DE C.V.**

Se anexa a la presente acta el listado de la verificación de los documentos que presenta cada uno de los licitantes en sus propuestas, señalando los folios que contiene, mismo que se firma para constancia documental.

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la consulta.

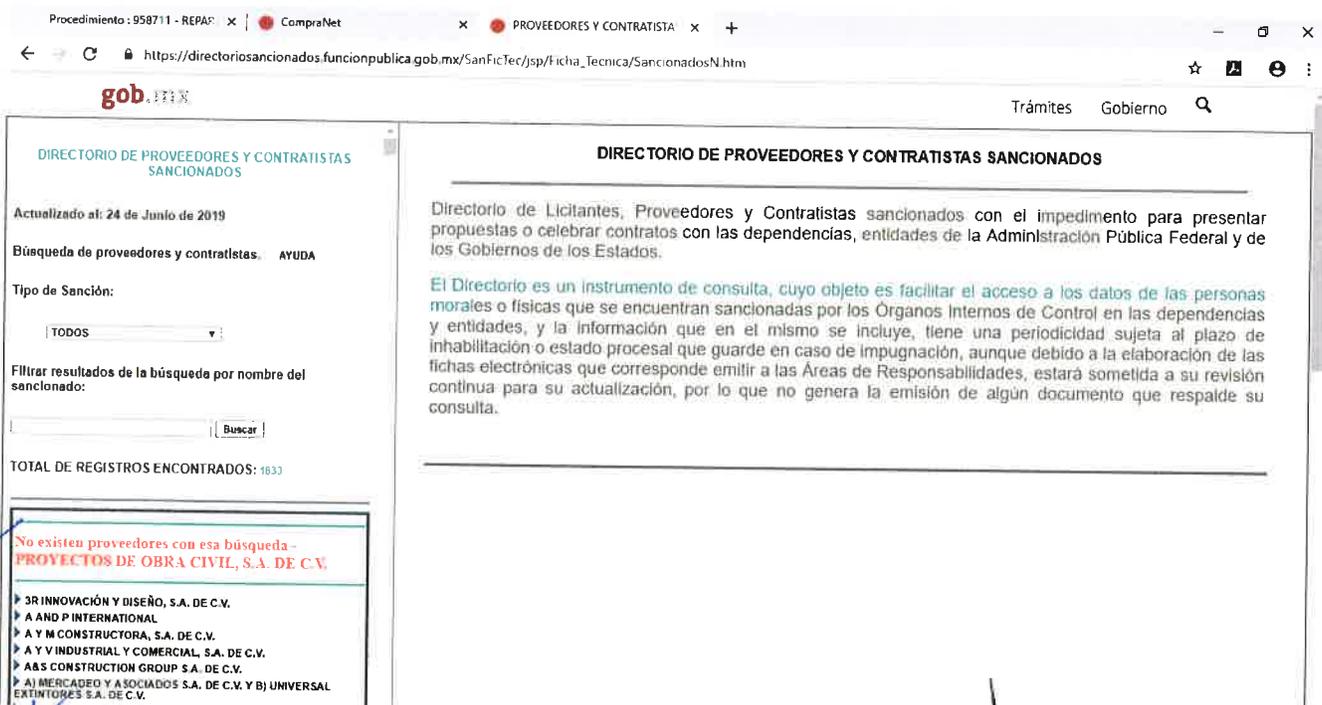

Procedimiento: 959711 - REPAR: x | CompraNet x | PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob. MX Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
[TODOS]

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:
[] [Buscar]

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1633

No existen proveedores con esa búsqueda - PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A) MERCADERO Y A SOCIADOS S.A. DE C.V. Y B) UNIVERSAL EXTINTORES S.A. DE C.V.



Procedimiento: 958711 - REPAR x CompraNet x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob.MEX Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1833

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCCIONES PEREZ Y GIL, S.A. DE C.V.

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNACIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A) MERCADERO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y B) UNIVERSAL EXTINTORES S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 958711 - REPAR x CompraNet x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob.MEX Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1833

No existen proveedores con esa búsqueda - INFRAESTRUCTURA MONARCA, S.A. DE C.V.

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNACIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A) MERCADERO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y B) UNIVERSAL EXTINTORES S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.



Procedimiento : 958716 - REPAF x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob. Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento : 958711 - REPAF x CompraNet x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob. Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

No existen proveedores con esa búsqueda - ARDICA CONSTRUCCIONES SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 958711 - REPAR x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

← → ↻ 🔒 https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm ☆ 👤 ⋮

gob.MEX Trámites Gobierno 🔍

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
[TODOS ▼]

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:
[] [**Buscar**]

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCCIONES LORO'S SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 958716 - REPAR x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

← → ↻ 🔒 https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm ☆ 👤 ⋮

gob.MEX Trámites Gobierno 🔍

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
[TODOS ▼]

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:
[] [**Buscar**]

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA YELIMAR SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Mich.
T: +52 (753) 53 3 07 00 www.puertolazarcardenas.com.mx

 **2019** 5
ENCARNAO SARRATA



Procedimiento : 958716 - REPAF x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

← → ↻ https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob. Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

No existen proveedores con esa búsqueda - TRITURADOS MIRALEJOS, S.A. DE C.V.

3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento : 958711 - REPAF x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

← → ↻ https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob. Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA SA DE CV

3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
A AND P INTERNATIONAL
A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Procedimiento: 958716 - REPAR x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob.mx Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
[TODOS]

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:
[] [Buscar]

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

No existen proveedores con esa búsqueda -
IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 958716 - REPAR x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob.mx Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
[TODOS]

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:
[] [Buscar]

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

No existen proveedores con esa búsqueda -
INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento : 958716 - REPAR x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob.mx Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
[TODOS]

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:
[] [Buscar]

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

**No existen proveedores con esa búsqueda -
INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y
PORTUARIA DEL SURESTE, S.A. DE
C.V.**

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento : 958716 - REPAR x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob.mx Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
[TODOS]

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:
[] [Buscar]

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

**No existen proveedores con esa búsqueda -
INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION
DEL SURESTE, S.A. DE C.V.**

► JR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.



Procedimiento: 958711 - REPAR x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob.mx Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

No existen proveedores con esa búsqueda - OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 958716 - REPAR x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Procedimiento: 958716 - REPAR x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob.mx Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSORCIO CONSTRUCTOR DE OBRAS MARINAS HB, S.A. DE C.V.

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 958716 - REPAF x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

← → ↻ https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob. Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
[TODOS]

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:
[] [Buscar]

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

No existen proveedores con esa búsqueda - ADMINISTRACION DE VALORES HB, S.A. DE C.V.

▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE LICITANTES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS CON EL IMPEDIMENTO PARA PRESENTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 958716 - REPAF x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

← → ↻ https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

gob. Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Junio de 2019

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
[TODOS]

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:
[] [Buscar]

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1834

No existen proveedores con esa búsqueda - OBRAS MARITIMAS HB, S.A. DE C.V.

▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.


▶ A AND P INTERNATIONAL

▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE LICITANTES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS CON EL IMPEDIMENTO PARA PRESENTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

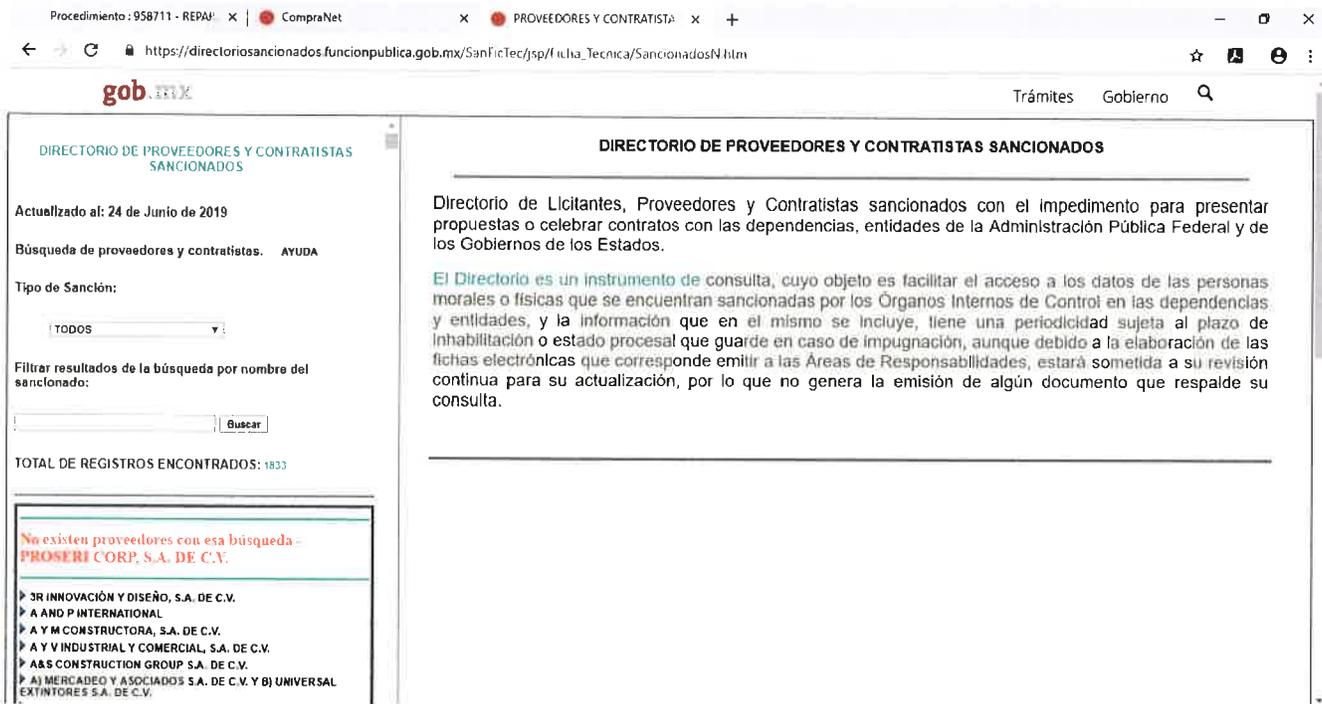


De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionado o inhabilitado, aceptándose las **12 (doce) proposiciones** para su **REVISIÓN DETALLADA**.

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

El licitante CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. de C.V. los archivos descargados de la plataforma de compranet los documentos DD-02 "manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada", DD-03 "convenio de proposición conjunta" y DD-04 "Anexo Uno y Dos", PT 12 "manifiesto del porcentaje mínimo de mano de local que los licitantes deberán incorporar en las obras a realizarse" y PT 13 "Escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social", no se abren marcando error en su intento. Se anexan las imágenes como evidencia en la presente acta.

El licitante CONSTRUCCIONES LORO´S, S.A. de C.V. en el DOCUMENTO PE-04 listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por la mano de obra presenta el DOCUMENTO PE-03 listado de insumos que intervienen en la integración de la

proposición, agrupado por los materiales y equipos de instalación permanente, en el DOCUMENTO PE-04 listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por la mano de obra presenta el DOCUMENTO PE-03 listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por los materiales y equipos de instalación permanente, en el DOCUMENTO PE-11 análisis, cálculo e integración para la determinación de los cargos adicionales, el licitante presenta los DOCUMENTOS PE-06 análisis, cálculo e integración para la determinación del factor de salario real y PE-10 análisis, cálculo e integración para la determinación del cargo por utilidad, en el DOCUMENTO PE-17 programa de erogaciones a costo directo de la maquinaria y equipo para construcción el licitante presenta el DOCUMENTO PE-16 programa de erogaciones a costo directo de la mano de obra.

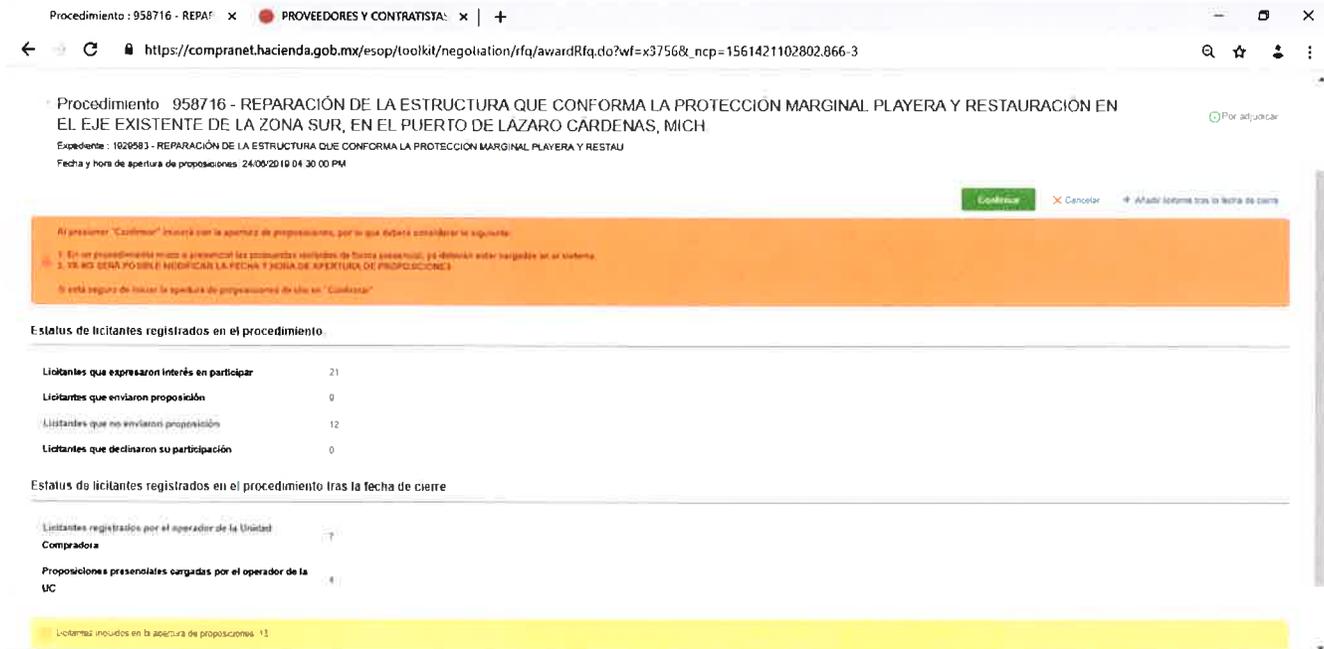

A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los precio propuestos:

| NOMBRE DEL LICITANTE: | PRECIO PROPUESTO (\$) |
|--|-------------------------|
| PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | \$118,700,868.40 |
| CONSTRUCCIONES PEREZ Y GIL, S.A. DE C.V. | \$134,370,340.64 |
| INFRAESTRUCTURA MONARCA, S.A. DE C.V. | \$99,034,413.99 |
| CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V. | \$88,786,517.07 |

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Mich.
T: +52 (753) 53 3 07 00 www.puertolazarocardenas.com.mx



2019 12
EMILIANO ZAPATA

ARDICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

\$125,670,331.15

CONSTRUCCIONES LORO ´S, S.A. DE C.V.

\$113,803,326.99

CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA TRITURADOS MIRALEJOS, S.A. DE C.V.

\$134,033,785.50

CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.

\$85,966,398.90

IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V.

\$89,652,516.35

INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA Y PORTUARIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA, DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y CON LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

\$133,899,486.33

OBRA CIVIL, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.

\$108,435,219.88

OBRAS MARÍTIMAS HB, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA CONSORCIO CONSTRUCTOR DE OBRAS MARINAS HB, S.A. DE C.V. Y CON LA EMPRESA ADMINISTRACIÓN DE VALORES HB, S.A. DE C.V.

\$138,661,707.49

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **13:00 horas, del día 15 de julio de 2019**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 20:30 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.**

GERENTE DE INGENIERÍA



ING. LUIS SÁNCHEZ Y LÓPEZ

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN



ING. RICARDO SÁNCHEZ CORTÉS

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**



ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
APILAC**



C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



ING. ALBERTO FELIPE RAMÍREZ

NOMBRE DEL LICITANTE:

 **PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.**

 **CONSTRUCCIONES PEREZ Y GIL, S.A. DE C.V.**

 **INFRAESTRUCTURA MONARCA, S.A. DE C.V.**

**NOMBRE Y FIRMA DE LA
EMPRESA**





CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.

PROSERI CORP, S.A. DE C.V.

ARDICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES LORO ´S, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA TRITURADOS MIRALEJOS, S.A. DE C.V

CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.

IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V.

INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA Y PORTUARIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA, DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y CON LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

OBRA CIVIL, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.

OBRAS MARÍTIMAS HB, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA CONSORCIO CONSTRUCTOR DE OBRAS MARINAS HB, S.A. DE C.V. Y CON LA EMPRESA ADMINISTRACIÓN DE VALORES HB, S.A. DE C.V.



COMPRANET

COMPRANET




COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

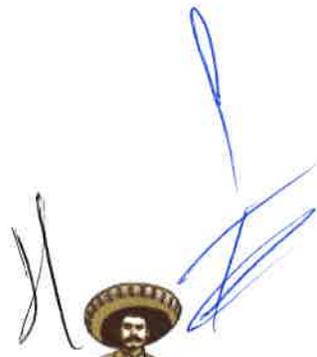



001-DD-03.zip

Archivo Ordenes Herramientas Favoritos Opciones Ayuda

Añadir Extraer en Comprobar Ver Eliminar Buscar Asistente Información Buscar virus Comentario auto extraíble

| Nombre | Tamaño | Comprimido | Tipo | Modificado |
|-------------|---------|------------|---------------------|------------------|
| - | | | Disco local | |
| DD-03.pdf | 439,714 | 408,078 | Adobe Acrobat Do... | 23/06/2019 08... |
| DD-03_1.pdf | 429,684 | 397,523 | Adobe Acrobat Do... | 23/06/2019 08... |

WinRAR: mensajes de diagnóstico

Mensaje

- ! L:\licitaciones\licitaciones 2019\01 - LICITACIONES PUBLICAS\PH-020-19 REPARACIÓN
- ! L:\licitaciones\licitaciones 2019\01 - LICITACIONES PUBLICAS\PH-020-19 REPARACIÓN

Cerrar Interrumpir la operación Copiar en el portapapeles

Total errores: 2

002-DD-02.zip

Archivo Ordenes Herramientas Favoritos Opciones Ayuda

Añadir Extraer en Comprobar Ver Eliminar Buscar Asistente Información Buscar virus Comentario

| Nombre | Tamaño | Comprimido | Tipo | Modificado |
|-----------------------|-----------|------------|---------------------|------------------|
| - | | | Disco local | |
| Acta Constitutivo pdf | 2,753,666 | 2,350,103 | Adobe Acrobat Do... | 23/02/2019 08... |
| DD-02.pdf | 575,961 | 536,198 | Adobe Acrobat Do... | 23/06/2019 08... |
| IFES.pdf | 720,927 | 703,812 | Adobe Acrobat Do... | 25/02/2019 05... |
| PODER.pdf | 1,319,815 | 1,270,039 | Adobe Acrobat Do... | 20/06/2019 04... |

WinRAR: mensajes de diagnóstico

Mensaje

- ! L:\licitaciones\licitaciones 2019\01 - LICITACIONES PUBLICAS\PH-020-19 REPARACIÓN

Cerrar Interrumpir la operación Copiar en el portapapeles

Total errores: 4

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



002-DD-02.zip - archivo ZIP, tamaño descomprimido 5,370,369 bytes

Archivo Ordenes Herramientas Favoritos Opciones Ayuda

Añadir Extraer en Comprobar Ver Eliminar Buscar Asistente Información Buscar virus Comentario auto extraíble

| Nombre | Tamaño | Comprimido | Tipo | Modificado | CRC32 |
|-----------------------|-----------|------------|---------------------|-------------------|----------|
| .. | | | Disco local | | |
| Acta Constitutiva.pdf | 2,753,666 | 2,350,103 | Adobe Acrobat Do... | 23/02/2019 08:... | 88CF65A4 |
| DD-02.pdf | 575,961 | 536,198 | Adobe Acrobat Do... | 23/06/2019 08:... | 590F907B |
| IFES.pdf | 720,927 | 705,812 | Adobe Acrobat Do... | 25/02/2019 05:... | 18D92791 |
| PODER.pdf | 1,319,815 | 1,270,039 | Adobe Acrobat Do... | 20/06/2019 04:... | 1CF3B4CA |

WinRAR: mensajes de diagnóstico

Mensaje

! [Licitaciones\licitaciones 2019\01] - LICITACIONES PUBLICAS\PH-020-19 REPARACIÓN PROTECCIÓN MARIT...
! C:\Users\user\AppData\Local\Temp\WinRAR\02019056_2035\FPGC\04\04.pdf: El archivo está dañado

Cancelar Interrumpir la operación Copiar en el portapapeles

Total errores: 2

004-DD-04.zip - archivo ZIP, tamaño descomprimido 623,244 bytes

Archivo Ordenes Herramientas Favoritos Opciones Ayuda

Añadir Extraer en Comprobar Ver Eliminar Buscar Asistente Información Buscar virus Comentario auto extraíble

| Nombre | Tamaño | Comprimido | Tipo | Modificado | CRC32 |
|-----------|---------|------------|---------------------|-------------------|----------|
| .. | | | Disco local | | |
| DD-04.pdf | 623,244 | 575,775 | Adobe Acrobat Do... | 23/06/2019 08:... | 51573142 |

WinRAR: mensajes de diagnóstico

Mensaje

! [Licitaciones\licitaciones 2019\01] - LICITACIONES PUBLICAS\PH-020-19 REPARACIÓN
! [Licitaciones\licitaciones 2019\01] - LICITACIONES PUBLICAS\PH-020-19 REPARACIÓN

Cancelar Interrumpir la operación Copiar en el portapapeles

Total errores: 2



[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




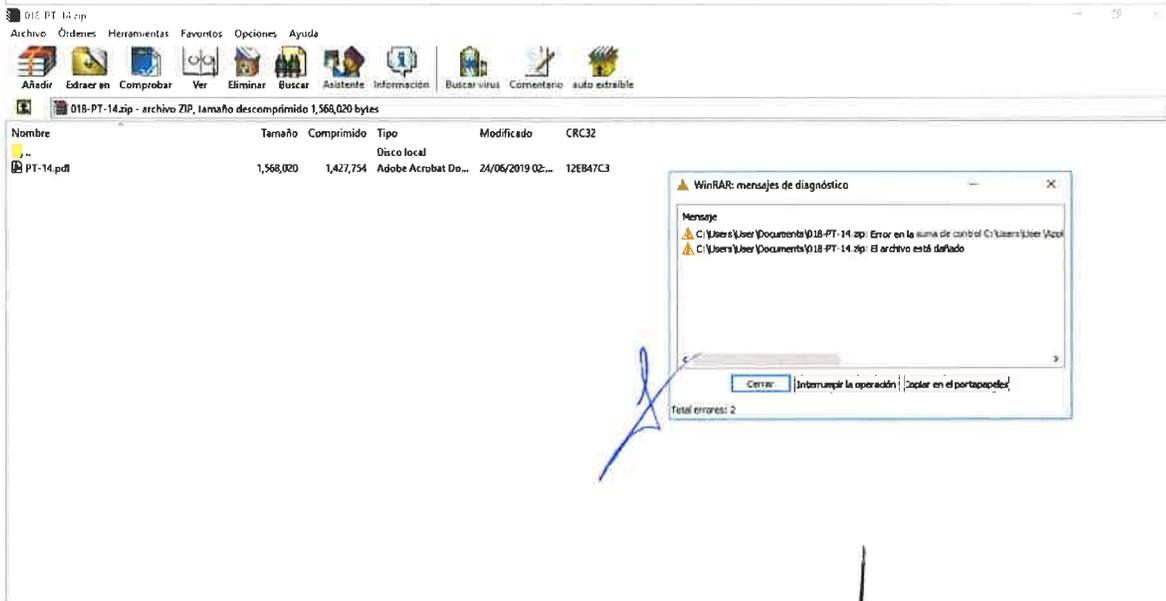

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| LICITANTE (S): | | PROYECTOS DE OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | | |
|---|---|--|-----------------------|------------------------|
| PROPUESTA | DOCUMENTO N° | DESCRIPCIÓN | Inicia en el folio N° | Termina en el folio N° |
| 2.1 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA | DD-01 | RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. | 001 | 028 |
| | DD-02 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN. | 029 | 052 |
| | | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA. | 053 | 055 |
| | | MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. | | |
| | DD-03 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM. | | |
| DD-04 | IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE. | | | |
| | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. | | | |
| | DD-03 | CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA. | 053 | 055 |
| | DD-04 | ANEXO UNO Y DOS. | 056 | 065 |
| 2.2 DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PROPUESTA TÉCNICA. | PT-01 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS. | 001 | 002 |
| | PT-02 | DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | 003 | 008 |
| | PT-03 | CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO. | 009 | 118 |
| | PT-04 | EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA. | 119 | 411 |
| | PT-05 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA. | 412 | 423 |
| | PT-06 | MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ. | 424 | 468 |
| | PT-07 | CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS, Y DECLARACIONES ANUALES (2017-2018). | 469 | 498 |
| | PT-08 | RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 499 | 500 |
| | PT-09 | MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. | 501 | 515 |
| | PT-10 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL. | 516 | — |
| | PT-11 | CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN | 517 | 518 |
| | PT-12 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LA OBRAS A REALIZAR. | 519 | — |
| | PT-13 | MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 520 | — |
| | PT-14 | DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D. | 521 | 522 |
| | PT-15 | DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN CUANTO A SEGURIDAD SOCIAL. | 523 | 524 |
| | PT-16 | DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PATRONALES. | 525 | 526 |
| | PT-17 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES | 527 | — |
| 2.3 DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PROPUESTA ECONÓMICA. | PE-01 | CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. | 001 | 002 |
| | PE-02 | ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. | 003 | 006 |
| | PE-03 | LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. | 007 | 017 |
| | PE-04 | LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA. | 018 | 019 |
| | PE-05 | LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 020 | — |
| | PE-06 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL. | 021 | 041 |
| | PE-07 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO. | 042 | 053 |
| | PE-08 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. | 054 | 057 |
| | PE-09 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. | 058 | 059 |
| | PE-10 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD. | 060 | — |
| | PE-11 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES. | 061 | 062 |
| | PE-12 | a) RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL | 063 | 064 |
| | PE-13 | CATÁLOGO DE CONCEPTOS | 065 | — |
| | PE-14 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS | 066 | 068 |
| | PE-15 | PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE | 069 | 071 |
| | PE-16 | PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA | 072 | 074 |
| | PE-17 | PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN. | 075 | 077 |
| | PE-18 | PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | 078 | 086 |

| LICITANTE (S): | | CONSTRUCCIONES PEREZ Y GIL, S.A DE C.V. | | |
|---|---|---|-----------------------|------------------------|
| PROPUESTA | DOCUMENTO N° | DESCRIPCIÓN | Inicia en el folio N° | Termina en el folio N° |
| 2.1 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA | DD-01 | RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. | 001 | 023 |
| | DD-02 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN. | 024 | |
| | | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA. | | |
| | | MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. | | |
| | DD-03 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 61 Y 78 DE LA LOPSRM. | | |
| | IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE. | | | |
| | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. | | 155 | |
| DD-03 | CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA. | 156 | 159 | |
| DD-04 | ANEXO UNO Y DOS. | 160 | 177 | |
| 2.2 DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PROPUESTA TÉCNICA. | PT-01 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS. | 001 | 095 |
| | PT-02 | DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | 096 | 120 |
| | PT-03 | CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO. | 121 | 175 |
| | PT-04 | EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA. | 176 | 318 |
| | PT-05 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA. | 319 | 523 |
| | PT-06 | MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ. | 524 | 584 |
| | PT-07 | CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS, Y DECLARACIONES ANUALES (2017-2018). | 585 | 640 |
| | PT-08 | RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 117,642 | 644 |
| | PT-09 | MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. | 645 | 673 |
| | PT-10 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL. | 674 | 675 |
| | PT-11 | CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN | 676 | 677 |
| | PT-12 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LA OBRAS A REALIZAR. | 678 | 680 |
| | PT-13 | MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 681 | 682 |
| | PT-14 | DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D. | 683 | 684 |
| | PT-15 | DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN CUANTO A SEGURIDAD SOCIAL. | 686 | 688 |
| | PT-16 | DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PATRONALES. | 689 | 691 |
| | PT-17 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES | 692 | 737 |
| 2.3 DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PROPUESTA ECONOMICA. | PE-01 | CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. | 001 | 004 |
| | PE-02 | ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. | 005 | 010 |
| | PE-03 | LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. | 011 | 019 |
| | PE-04 | LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA. | 020 | 021 |
| | PE-05 | LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 022 | 023 |
| | PE-06 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL. | 024 | 032 |
| | PE-07 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO. | 033 | 036 |
| | PE-08 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. | 037 | 042 |
| | PE-09 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. | 043 | 045 |
| | PE-10 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD. | 046 | 047 |
| | PE-11 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES. | 048 | 054 |
| | PE-12 | a) RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS | 055 | 058 |
| | PE-13 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS | 059 | 060 |
| | PE-14 | PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE | 061 | 064 |
| | PE-15 | PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA | 065 | 066 |
| | PE-16 | PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN. | 067 | 068 |
| | PE-17 | PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | 069 | 070 |
| | PE-18 | | 071 | 074 |
| | | IMPORTE DE PROPUESTA ECONOMICA: | | \$ 134,370,340.64 |

LICITACION No.
RUBRO:

"REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA PROTECCIÓN MARGINAL PLAYERA Y RESTAURACIÓN EN EL EJE EXISTENTE DE LA ZONA SUR, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."

lunes, 24 de junio de 2019

| LICITANTE (S): | | INFRAESTRUCTURA MONARCA, S.A. DE C.V. | | |
|---|---|--|-----------------------|------------------------|
| PROPUESTA | DOCUMENTO N° | DESCRIPCION | Inicia en el folio N° | Termina en el folio N° |
| 2.1 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA | DD-01 | RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. | 001 | 009 |
| | DD-02 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN. | 010 | 186 |
| | | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA. | | |
| | | MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. | | |
| | | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 61 Y 78 DE LA LOPSRM. | | |
| DD-03 | IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE. | | | |
| | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. | | | |
| DD-03 | CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA. | 187 | - | |
| DD-04 | ANEXO UNO Y DOS. | 188 | 197 | |
| 2.2 DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PROPUESTA TÉCNICA. | PT-01 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS. | 09 | 017 |
| | PT-02 | DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | 018 | 095 |
| | PT-03 | CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO. | 096 | 287 |
| | PT-04 | EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA. | 288 | 584 |
| | PT-05 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA. | 585 | - |
| | PT-06 | MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ. | 586 | 659 |
| | PT-07 | CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS, Y DECLARACIONES ANUALES (2017-2018). | 660 | 711 |
| | PT-08 | RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 712 | 733 |
| | PT-09 | MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. | 734 | - |
| | PT-10 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL. | 735 | - |
| | PT-11 | CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN | 736 | 737 |
| | PT-12 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MAÑO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LA OBRAS A REALIZAR. | 738 | - |
| | PT-13 | MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 739 | - |
| | PT-14 | DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D. | 740 | 741 |
| | PT-15 | DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN CUANTO A SEGURIDAD SOCIAL. | 742 | 743 |
| | PT-16 | DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PATRONALES. | 744 | 745 |
| | PT-17 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES | 746 | 1041 |
| 2.3 DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PROPUESTA ECONOMICA. | PE-01 | CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. | 001 | 010 |
| | PE-02 | ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. | 011 | 016 |
| | PE-03 | LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. | 017 | 019 |
| | PE-04 | LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA. | 020 | - |
| | PE-05 | LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 021 | - |
| | PE-06 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL. | 022 | 025 |
| | PE-07 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO. | 026 | 028 |
| | PE-08 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. | 029 | 030 |
| | PE-09 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. | 031 | 032 |
| | PE-10 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD. | 033 | - |
| | PE-11 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES. | 034 | - |
| | PE-12 | a) RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; EN HOJA MEMBRADA DE LA EMPRESA DEL | 035 | 036 |
| | PE-13 | CATÁLOGO DE CONCEPTOS | 037 | - |
| | PE-14 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS | 038 | - |
| | PE-15 | PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE | 039 | - |
| | PE-16 | PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA | 040 | - |
| | PE-17 | PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN. | 041 | - |
| | PE-18 | PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | 042 | - |

IMPORTE DE PROPUESTA ECONOMICA: \$ 99,034,413.99

"REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA PROTECCIÓN MARGINAL PLAYERA Y RESTAURACIÓN EN EL EJE EXISTENTE DE LA ZONA SUR, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."

lunes, 24 de junio de 2019

| LICITANTE (S): | | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CESTA MICHOTECAN SA. DE C.V. | | |
|---|---|--|-----------------------|------------------------|
| PROPUESTA | DOCUMENTO N° | DESCRIPCIÓN | Inicia en el folio N° | Termina en el folio N° |
| 2.1 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA | DD-01 | RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. | 001 | 017 |
| | DD-02 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN. | 018 | |
| | | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA. | | |
| | | MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. | | |
| | DD-03 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM. | | |
| | IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE. | | | |
| | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. | | 084 | |
| DD-04 | CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA. | 085 | 087 | |
| | ANEXO UNO Y DOS. | 088 | 104 | |
| 2.2 DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PROPUESTA TÉCNICA. | PT-01 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS. | 001 | 019 |
| | PT-02 | DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | 020 | 101-D |
| | PT-03 | CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO. | 102 | 223 |
| | PT-04 | EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA. | 224 | 526 |
| | PT-05 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA. | 527 | 528 |
| | PT-06 | MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ. | 529 | 586 |
| | PT-07 | CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS, Y DECLARACIONES ANUALES (2017-2018). | 587 | 632 |
| | PT-08 | RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 633 | 645 |
| | PT-09 | MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. | 646 | 658 |
| | PT-10 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL. | 659 | 660 |
| | PT-11 | CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN | 661 | 662 |
| | PT-12 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LA OBRAS A REALIZAR. | 663 | 664 |
| | PT-13 | MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 665 | 666 |
| | PT-14 | DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D. | 667 | 669 |
| | PT-15 | DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN CUANTO A SEGURIDAD SOCIAL. | 670 | 672 |
| | PT-16 | DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PATRONALES. | 673 | 675 |
| | PT-17 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES | 676 | 710 |
| 2.3 DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PROPUESTA ECONÓMICA. | PE-01 | CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. | 001 | 006 |
| | PE-02 | ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. | 007 | 014 |
| | PE-03 | LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. | 015 | 016 |
| | PE-04 | LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA. | 017 | 018 |
| | PE-05 | LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 019 | 020 |
| | PE-06 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL. | 021 | 029 |
| | PE-07 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO. | 030 | 039 |
| | PE-08 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. | 040 | 044 |
| | PE-09 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. | 045 | 048 |
| | PE-10 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD. | 049 | 050 |
| | PE-11 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES. | 051 | 053 |
| | PE-12 | a) RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL | 054 | 057 |
| | PE-13 | CATÁLOGO DE CONCEPTOS | 058 | 060 |
| | PE-14 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS | 061 | 080 |
| | PE-15 | PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE | 081 | 085 |
| | PE-16 | PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA | 086 | 090 |
| | PE-17 | PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN. | 091 | 095 |
| | PE-18 | PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | 096 | 097 |

IMPORTE DE PROPUESTA ECONOMICA:

\$ 88,786,517.07



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 49

| Nombre del Archivo | |
|--------------------|---|
| 1 | /rfq_958716_price/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Anexos Firmados Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m |
| 2 | /rfq_958716_price/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Anexos Firmados Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf |
| 3 | /rfq_958716_price/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Anexos Firmados Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf |
| 4 | /rfq_958716_price/ARDICA CONSTRUCCION-5157/supplier.txt |
| 5 | /rfq_958716_price/rfq.txt |
| 6 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Anexos Firmados Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m |
| 7 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Anexos Firmados Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf |
| 8 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Anexos Firmados Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf |
| 9 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento DD-01/001-DD-01.pdf |
| 10 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento DD-02/002-DD-02.pdf |
| 11 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento DD-03/003-DD-03.pdf |
| 12 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento DD-04/004-DD-04.pdf |
| 13 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-01/022-PE-01.pdf |
| 14 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-02/023-PE-02.rar |
| 15 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-03/024-PE-03..pdf |
| 16 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-04/025-PE-04.pdf |
| 17 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-05/026-PE-05.pdf |
| 18 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-06/027-PE-06 ..pdf |
| 19 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-07/028-PE-07..pdf |
| 20 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-08/029-PE-08.pdf |
| 21 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-09/030-PE-09..pdf |
| 22 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-10/031-PE-10.pdf |
| 23 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-11/032-PE-11.pdf |
| 24 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-12/033-PE-12..pdf |
| 25 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-13/034-PE-13.rar |
| 26 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-14/035-PE-14.pdf |
| 27 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-15/036-PE-15.pdf |
| 28 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-16/037-PE-16.pdf |
| 29 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-17/038-PE-17.pdf |
| 30 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PE-18/039-PE-18.pdf |
| 31 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-01/005-PT-01.pdf |
| 32 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-02/006-PT-02..pdf |
| 33 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-03/007-PT-03.pdf |
| 34 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-04/008-PT-04.pdf |
| 35 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-05/009-PT-05.pdf |
| 36 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-06/010-PT-06.pdf |
| 37 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-07/011-PT-07..pdf |
| 38 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-08/012-PT-08..pdf |
| 39 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-09/013-PT-09.pdf |
| 40 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-10/014-PT-10.pdf |
| 41 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-11/015-PT-11.pdf |
| 42 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-12/016-PT-12.pdf |
| 43 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-13/017-PT-13.pdf |
| 44 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-14/018-PT-14.pdf |
| 45 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-15/019-PT-15.pdf |
| 46 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-16/020-PT-16.pdf |
| 47 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/Documento PT-17/021-PT-17_ok.pdf |
| 48 | /rfq_958716_tech/ARDICA CONSTRUCCION-5157/supplier.txt |
| 49 | /rfq_958716_tech/rfq.txt |



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

| Nombre del Archivo | |
|--------------------|---|
| 1 | rfq_958716_price/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m |
| 2 | rfq_958716_price/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf |
| 3 | rfq_958716_price/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf |
| 4 | rfq_958716_price/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/supplier.txt |
| 5 | rfq_958716_price/rfq.txt |
| 6 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m |
| 7 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf |
| 8 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf |
| 9 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_DD-01/001-DD-01.zip |
| 10 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_DD-02/002-DD-02.zip |
| 11 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_DD-03/003-DD-03.zip |
| 12 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_DD-04/004-DD-04.zip |
| 13 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-01/022-PE-01.zip |
| 14 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-02/023-PE-02.zip |
| 15 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-03/024-PE-03.zip |
| 16 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-04/025-PE-04.zip |
| 17 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-05/026-PE-05.zip |
| 18 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-06/027-PE-06.zip |
| 19 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-07/028-PE-07.zip |
| 20 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-08/029-PE-08.zip |
| 21 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-09/030-PE-09.zip |
| 22 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-10/031-PE-10.zip |
| 23 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-11/032-PE-11.zip |
| 24 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-12/033-PE-12.zip |
| 25 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-13/034-PE-13.zip |
| 26 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-14/035-PE-14.zip |
| 27 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-15/036-PE-15.zip |
| 28 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-16/037-PE-16.zip |
| 29 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-17/038-PE-17.zip |
| 30 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PE-18/039-PE-18.zip |
| 31 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-01/005-PT-01.zip |
| 32 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-02/006-PT-02.zip |
| 33 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-03/007-PT-03.zip |
| 34 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-04/008-PT-04.zip |
| 35 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-05/009-PT-05.zip |
| 36 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-06/010-PT-06.zip |
| 37 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-07/011-PT-07.zip |
| 38 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-08/012-PT-08.zip |
| 39 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-09/013-PT-09.zip |
| 40 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-10/014-PT-10.zip |
| 41 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-11/015-PT-11.zip |
| 42 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-12/016-PT-12.zip |
| 43 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-13/017-PT-13.zip |
| 44 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-14/018-PT-14.zip |
| 45 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-15/019-PT-15.zip |
| 46 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-16/020-PT-16.zip |
| 47 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/Documento_PT-17/021-PT-17.zip |
| 48 | rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_LORO-33656/supplier.txt |
| 49 | rfq_958716_tech/rfq.txt |

Handwritten signatures and marks in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 47

| Nombre del Archivo | |
|--------------------|--|
| 1 | /rfq_958716_price/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Anexos Firmados Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf |
| 2 | /rfq_958716_price/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Anexos Firmados Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf_rpt.pdf |
| 3 | /rfq_958716_price/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/supplier.txt |
| 4 | /rfq_958716_price/rfq.txt |
| 5 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Anexos Firmados Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf |
| 6 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Anexos Firmados Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_rpt.pdf |
| 7 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_DD-01/001-DD-01 MANIFESTACION DE INTERES.pdf |
| 8 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_DD-02/002-DD-02 MANIFESTACION DE FACULTADES.pdf |
| 9 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_DD-03/003-DD-03 MANIFESTACION DE PROPOSICION CONJUNTA.pdf |
| 10 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_DD-04/004-DD-04 NOTA INFORMATIVA.pdf |
| 11 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-01/022-PE-01 CARTA COMPROMISO.pdf |
| 12 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-02/023-PE-02 ANALISIS DE P.U.pdf |
| 13 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-03/024-PE-03 LISTADO DE INSUMOS (MATERIALES).pdf |
| 14 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-04/025-PE-04 LISTADO DE INSUMOS (MANO DE OBRA).pdf |
| 15 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-05/026-PE-05 LISTADO DE INSUMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO).pdf |
| 16 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-06/027-PE-06 ANALISIS DE FACTOR DE SALARIO REAL.pdf |
| 17 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-07/028-PE-07 COSTOS HORARIOS.pdf |
| 18 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-08/029-PE-08 CALCULO DE INDIRECTOS.pdf |
| 19 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-09/030-PE-09 COSTO POR FINANCIAMIENTO.pdf |
| 20 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-10/031-PE-10 CARGO POR UTILIDAD.pdf |
| 21 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-11/032-PE-11 CARGOS ADICIONALES.pdf |
| 22 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-12/033-PE-12 ANALISIS DE COSTOS BASICOS.pdf |
| 23 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-13/034-PE-13 CATALOGO DE CONCEPTOS.pdf |
| 24 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-14/035-PE-14 PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA.pdf |
| 25 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-15/036-PE-15 PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES.pdf |
| 26 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-16/037-PE-16 PROGRAMA DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA.pdf |
| 27 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-17/038-PE-17 PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA.pdf |
| 28 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PE-18/039-PE-18 PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO.pdf |
| 29 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-01/005-PT-01 MANIFESTACION DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS.pdf |
| 30 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-02/006-PT-02 DESCRIPCION INTEGRAL DE LOS TRABAJOS.pdf |
| 31 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-03/007-PT-03 CURRICULUM DE LOS TRABAJADORES.zip |
| 32 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-04/008-PT-04 RELACION DE CONTRATOS.zip |
| 33 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-05/009-PT-05 MANIFESTACION DE CONOCIMIENTO DE NORMAS Y PROYECTO.pdf |
| 34 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-06/010-PT-06 MANIFESTACION DE DE SUBCONTRATAcion.pdf |
| 35 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-07/011-PT-07 DECLARACIONES Y ESTADOS FINANCIEROS.zip |
| 36 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-08/012-PT-08 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.pdf |
| 37 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-09/013-PT-09 MODELO DE CONTRATO.pdf |
| 38 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-10/014-PT-10 MANIFESTACION DE MANO DE OBRA LOCAL.pdf |
| 39 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-11/015-PT-11 MANIFESTACION DE CONOCER EL ACUERDO API-CMIC-ICIC.pdf |
| 40 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-12/016-PT-12 MANIFESTACION DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA LOCAL.pdf |
| 41 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-13/017-PT-13 MANIFESTACION DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD.pdf |
| 42 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-14/018-PT-14 OPINION DE OBLIGACIONES DEL SAT.pdf |
| 43 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-15/019-PT-15 OPINION DE OBLIGACIONES DEL IMSS.pdf |
| 44 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-16/020-PT-16 OPINION DE CUMPLIMIENTO DE INFONAVIT.pdf |
| 45 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/Documento_PT-17/021-PT-17 MANIFESTACION DE CONOCER LAS ESPECIFICACIONES.pdf |
| 46 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCCIONES_PERE-716115/supplier.txt |
| 47 | /rfq_958716_tech/rfq.txt |



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 47

| Nombre del Archivo | |
|--------------------|---|
| 1 | /rfq_958716_price/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Anexos Firmados Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary (1).pdf |
| 2 | /rfq_958716_price/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Anexos Firmados Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary (1).pdf_rpt.pdf |
| 3 | /rfq_958716_price/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/supplier.txt |
| 4 | /rfq_958716_price/rfq.txt |
| 5 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Anexos Firmados Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary (1).pdf |
| 6 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Anexos Firmados Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary (1).pdf_rpt.pdf |
| 7 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento DD-01/001-DD 01.pdf |
| 8 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento DD-02/002-DD 02.zip |
| 9 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento DD-03/003-DD 03.pdf |
| 10 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento DD-04/004-DD 04.pdf |
| 11 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PE-01/022-PE-01.pdf |
| 12 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PE-02/023-PE-02.pdf |
| 13 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PE-03/024-PE-03.pdf |
| 14 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PE-04/025-PE-04.pdf |
| 15 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PE-05/026-PE-05.pdf |
| 16 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PE-06/027-PE-06.zip |
| 17 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PE-07/028-PE-07.zip |
| 18 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PE-08/029-PE-08.pdf |
| 19 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PE-09/030-PE-09.zip |
| 20 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PE-10/031-PE-10.pdf |
| 21 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PE-11/032-PE-11.pdf |
| 22 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PE-12/033-PE-12.zip |
| 23 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PE-13/034-PE-13.pdf |
| 24 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PE-14/035-PE-14.zip |
| 25 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PE-15/036-PE-15.zip |
| 26 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PE-16/037-PE-16.zip |
| 27 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PE-17/038-PE-17.zip |
| 28 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PE-18/039-PE-18.pdf |
| 29 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PT-01/005-PT 1.zip |
| 30 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PT-02/006-PT 2.pdf |
| 31 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PT-03/007-PT 3.zip |
| 32 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PT-04/008-PT 4.zip |
| 33 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PT-05/009-PT 5.pdf |
| 34 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PT-06/010-PT 6.zip |
| 35 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PT-07/011-PT 7.zip |
| 36 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PT-08/012-PT 8.pdf |
| 37 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PT-09/013-PT 9.pdf |
| 38 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PT-10/014-PT 10.pdf |
| 39 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PT-11/015-PT 11.pdf |
| 40 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PT-12/016-PT 12.pdf |
| 41 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PT-13/017-PT 13.pdf |
| 42 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PT-14/018-PT 14.zip |
| 43 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PT-15/019-PT 15.zip |
| 44 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PT-16/020-PT 16.zip |
| 45 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/Documento PT-17/021-PT 17.pdf |
| 46 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA Y ARRE-375425/supplier.txt |
| 47 | /rfq_958716_tech/rfq.txt |

Handwritten signatures and marks in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

| Nombre del Archivo | |
|--------------------|--|
| 1 | /rfq_958716_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-1862323_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m |
| 2 | /rfq_958716_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-1862323_PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf |
| 3 | /rfq_958716_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-1862323_PriceEnvelopeSummary.pdf |
| 4 | /rfq_958716_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/supplier.txt |
| 5 | /rfq_958716_price/rfq.txt |
| 6 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-1862322_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m |
| 7 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-1862322_TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m rpt.pdf |
| 8 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-1862322_TechnicalEnvelopeSummary.pdf |
| 9 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento DD-01/001-DD-01.zip |
| 10 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento DD-02/002-DD-02.zip |
| 11 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento DD-03/003-DD-03.zip |
| 12 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento DD-04/004-DD-04.zip |
| 13 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-01/022-PE-01.pdf |
| 14 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-02/023-PE-02.pdf |
| 15 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-03/024-PE-03.pdf |
| 16 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-04/025-PE-04.pdf |
| 17 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-05/026-PE-05.pdf |
| 18 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-06/027-PE-06.pdf |
| 19 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-07/028-PE-07.pdf |
| 20 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-08/029-PE-08.pdf |
| 21 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-09/030-PE-09.pdf |
| 22 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-10/031-PE-10.pdf |
| 23 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-11/032-PE-11.pdf |
| 24 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-12/033-PE-12.pdf |
| 25 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-13/034-PE-13.pdf |
| 26 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-14/035-PE-14.pdf |
| 27 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-15/036-PE-15.pdf |
| 28 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-16/037-PE-16.pdf |
| 29 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-17/038-PE-17.pdf |
| 30 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PE-18/039-PE-18.pdf |
| 31 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-01/005-PT-01.zip |
| 32 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-02/006-PT-02.zip |
| 33 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-03/007-PT-03.zip |
| 34 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-04/008-PT-04.zip |
| 35 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-05/009-PT-05.zip |
| 36 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-06/010-PT-06.zip |
| 37 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-07/011-PT-07.zip |
| 38 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-08/012-PT-08.zip |
| 39 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-09/013-PT-09.zip |
| 40 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-10/014-PT-10.zip |
| 41 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-11/015-PT-11.zip |
| 42 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-12/016-PT-12.zip |
| 43 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-13/017-PT-13.zip |
| 44 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-14/018-PT-14.zip |
| 45 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-15/019-PT-15.zip |
| 46 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-16/020-PT-16.zip |
| 47 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento PT-17/021-PT-17.zip |
| 48 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/supplier.txt |
| 49 | /rfq_958716_tech/rfq.txt |



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 41

| Nombre del Archivo | | | | |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| 1 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | DD-01/001-DD-01.zip | |
| 2 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | DD-02/002-DD-02.zip | |
| 3 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | DD-03/003-DD-03.zip | |
| 4 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | DD-04/004-DD-04.zip | |
| 5 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PE-01/022-PE-01.zip | |
| 6 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PE-02/023-PE02.zip | |
| 7 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PE-03/024-PE-03.zip | |
| 8 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PE-04/025-PE04.zip | |
| 9 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PE-05/026-PE05.zip | |
| 10 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PE-06/027-PE-06.zip | |
| 11 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PE-07/028-PE07.zip | |
| 12 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PE-08/029-PE08.zip | |
| 13 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PE-09/030-PE09.rar | |
| 14 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PE-10/031-Utilidad PE_10.zip | |
| 15 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PE-11/032-PE11.zip | |
| 16 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PE-12/033-PE-12.zip | |
| 17 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PE-13/034-PE-13.zip | |
| 18 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PE-14/035-PE14.zip | |
| 19 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PE-15/036-PE15.zip | |
| 20 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PE-16/037-PE16.zip | |
| 21 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PE-17/038-PE17.zip | |
| 22 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PE-18/039-PE18.zip | |
| 23 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PT-01/005-PT-01.zip | |
| 24 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PT-02/006-PT-02.zip | |
| 25 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PT-03/007-PT-03.zip | |
| 26 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PT-04/008-PT-04.zip | |
| 27 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PT-05/009-PT-05.zip | |
| 28 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PT-06/010-PT-06.zip | |
| 29 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PT-07/011-PT-07.zip | |
| 30 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PT-08/012-PT-08.zip | |
| 31 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PT-09/013-PT-09.zip | |
| 32 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PT-10/014-PT-10.zip | |
| 33 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PT-11/015-PT-11.zip | |
| 34 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PT-12/016-PT-12.zip | |
| 35 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PT-13/017-PT-13.zip | |
| 36 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PT-14/018-PT-14.zip | |
| 37 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PT-15/019-PT-15.zip | |
| 38 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PT-16/020-PT-16.zip | |
| 39 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/Documento | PT-17/021-PT-17.zip | |
| 40 | /rfq_958716_tech/CONSTRUCTORES | INDUS-476193/supplier.txt | | |
| 41 | /rfq_958716_tech/rfq.txt | | | |



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 41

| Nombre del Archivo | |
|--------------------|--|
| 1 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_DD-01/001-DD01-020-ICL.pdf |
| 2 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_DD-02/002-DD02-020-ICL.pdf |
| 3 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_DD-03/003-DD03-020-ICL.pdf |
| 4 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_DD-04/004-DD04-020-ICL.pdf |
| 5 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-01/022-PE01-020-ICL.pdf |
| 6 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-02/023-PE02-021-ICL.zip |
| 7 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-03/024-PE03-020-ICL.pdf |
| 8 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-04/025-PE04-020-ICL.pdf |
| 9 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-05/026-PE05-020-ICL.pdf |
| 10 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-06/027-PE06-020-ICL.pdf |
| 11 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-07/028-PE07-020-ICL.pdf |
| 12 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-08/029-PE08-020-ICL.pdf |
| 13 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-09/030-PE09-020-ICL.pdf |
| 14 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-10/031-PE10-020-ICL.pdf |
| 15 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-11/032-PE11-020-ICL.pdf |
| 16 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-12/033-PE12-020-ICL.pdf |
| 17 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-13/034-PE13-021-ICL.zip |
| 18 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-14/035-PE14-020-ICL.pdf |
| 19 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-15/036-PE15-020-ICL.pdf |
| 20 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-16/037-PE16-020-ICL.pdf |
| 21 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-17/038-PE17-020-ICL.pdf |
| 22 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-18/039-PE18-020-ICL.pdf |
| 23 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-01/005-PT01-020-ICL.pdf |
| 24 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-02/006-PT02-020-ICL.pdf |
| 25 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-03/007-PT03-020-ICL.pdf |
| 26 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-04/008-PT04-020-ICL.pdf |
| 27 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-05/009-PT05-020-ICL.pdf |
| 28 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-06/010-PT06-020-ICL.pdf |
| 29 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-07/011-PT07-020-ICL.pdf |
| 30 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-08/012-PT08-020-ICL.pdf |
| 31 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-09/013-PT09-020-ICL.pdf |
| 32 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-10/014-PT10-020-ICL.pdf |
| 33 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-11/015-PT11-020-ICL.pdf |
| 34 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-12/016-PT12-020-ICL.pdf |
| 35 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-13/017-PT13-020-ICL.pdf |
| 36 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-14/018-PT14-020-ICL.pdf |
| 37 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-15/019-PT15-020-ICL.pdf |
| 38 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-16/020-PT16-020-ICL.pdf |
| 39 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-17/021-PT17-020-ICL.pdf |
| 40 | /rfq_958716_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/supplier.txt |
| 41 | /rfq_958716_tech/rfq.txt |

Handwritten signatures and marks in blue and black ink are present on the page, including a large signature on the left, a signature on the right, and various scribbles and lines.



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 52

| Nombre del Archivo | |
|--------------------|---|
| 1 | /rfq_958716_price/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Anexos Firmados Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m |
| 2 | /rfq_958716_price/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Anexos Firmados Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf |
| 3 | /rfq_958716_price/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Anexos Firmados Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf |
| 4 | /rfq_958716_price/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/supplier.txt |
| 5 | /rfq_958716_price/rfq.txt |
| 6 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Anexos Firmados Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m |
| 7 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Anexos Firmados Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf |
| 8 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Anexos Firmados Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf |
| 9 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Anexos Genéricos/001-PT-04 CONTRATOS PARTE 2 DE 3.pdf |
| 10 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Anexos Genéricos/002-PT-04 CONTRATOS PARTE 3 DE 3.pdf |
| 11 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Anexos Genéricos/PT-04 CONTRATOS PARTE 1 DE 3.pdf |
| 12 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento DD-01/001-DD-01.pdf |
| 13 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento DD-02/002-DD-02.pdf |
| 14 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento DD-03/003-DD-03.pdf |
| 15 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento DD-04/004-DD-04.pdf |
| 16 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PE-01/022-PE-01.pdf |
| 17 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PE-02/023-PE-02.zip |
| 18 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PE-03/024-PE-03.pdf |
| 19 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PE-04/025-PE-04.pdf |
| 20 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PE-05/026-PE-05.pdf |
| 21 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PE-06/027-PE-06.pdf |
| 22 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PE-07/028-PE-07.pdf |
| 23 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PE-08/029-PE-08.pdf |
| 24 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PE-09/030-PE-09.pdf |
| 25 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PE-10/031-PE-10.pdf |
| 26 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PE-11/032-PE-11.pdf |
| 27 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PE-12/033-PE-12.pdf |
| 28 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PE-13/034-PE-13.zip |
| 29 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PE-14/035-PE-14.zip |
| 30 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PE-15/036-PE-15.pdf |
| 31 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PE-16/037-PE-16.pdf |
| 32 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PE-17/038-PE-17.pdf |
| 33 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PE-18/039-PE-18.pdf |
| 34 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PT-01/005-PT-01.pdf |
| 35 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PT-02/006-PT-02.pdf |
| 36 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PT-03/007-PT-03.zip |
| 37 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PT-04/008-PT-04.pdf |
| 38 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PT-05/009-PT-05.pdf |
| 39 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PT-06/010-PT-06.pdf |
| 40 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PT-07/011-PT-07.pdf |
| 41 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PT-08/012-PT-08.pdf |
| 42 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PT-09/013-PT-09.pdf |
| 43 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PT-10/014-PT-10.pdf |
| 44 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PT-11/015-PT-11.pdf |
| 45 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PT-12/016-PT-12.pdf |
| 46 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PT-13/017-PT-13.pdf |
| 47 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PT-14/018-PT-14.pdf |
| 48 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PT-15/019-PT-15.pdf |
| 49 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PT-16/020-PT-16.pdf |
| 50 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/Documento PT-17/021-PT-17.pdf |
| 51 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-659827/supplier.txt |
| 52 | /rfq_958716_tech/rfq.txt |



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 47

| Nombre del Archivo | |
|--------------------|---|
| 1 | /rfq_958716_price/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf |
| 2 | /rfq_958716_price/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf_rpt.pdf |
| 3 | /rfq_958716_price/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/supplier.txt |
| 4 | /rfq_958716_price/rfq.txt |
| 5 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf |
| 6 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_rpt.pdf |
| 7 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_DD-01/001-DD01.pdf |
| 8 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_DD-02/002-DD-02.zip |
| 9 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_DD-03/003-DD03.pdf |
| 10 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_DD-04/004-DD04.pdf |
| 11 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-01/022-PE01.pdf |
| 12 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-02/023-PE02.pdf |
| 13 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-03/024-PE03.pdf |
| 14 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-04/025-PE04.pdf |
| 15 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-05/026-PE05.pdf |
| 16 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-06/027-PE06.pdf |
| 17 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-07/028-PE07.pdf |
| 18 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-08/029-PE08.pdf |
| 19 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-09/030-PE09.pdf |
| 20 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-10/031-PE10.pdf |
| 21 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-11/032-PE11.pdf |
| 22 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-12/033-PE12.pdf |
| 23 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-13/034-PE13.pdf |
| 24 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-14/035-PE14.pdf |
| 25 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-15/036-PE15.pdf |
| 26 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-16/037-PE16.pdf |
| 27 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-17/038-PE17.pdf |
| 28 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PE-18/039-PE18.pdf |
| 29 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf |
| 30 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-02/006-PT-02.zip |
| 31 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-03/007-PT-03.zip |
| 32 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-04/008-PT-04.zip |
| 33 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf |
| 34 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf |
| 35 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf |
| 36 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf |
| 37 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf |
| 38 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf |
| 39 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf |
| 40 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf |
| 41 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf |
| 42 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf |
| 43 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf |
| 44 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf |
| 45 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/Documento_PT-17/021-PT-17.zip |
| 46 | /rfq_958716_tech/INFRAESTRUCTURA_MON-716116/supplier.txt |
| 47 | /rfq_958716_tech/rfq.txt |



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

- 1 /rfq_958716_price/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/001-1862188_PriceEnvelopeSummary (4).pdf.p7m
- 2 /rfq_958716_price/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/002-1862188_PriceEnvelopeSummary (4).pdf.p7m rpt.pdf
- 3 /rfq_958716_price/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/003-1862188_PriceEnvelopeSummary (4).pdf
- 4 /rfq_958716_price/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/supplier.txt
- 5 /rfq_958716_price/rfq.txt
- 6 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/040-1862187_TechnicalEnvelopeSummary (4).pdf.p7m
- 7 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/041-1862187_TechnicalEnvelopeSummary (4).pdf.p7m rpt.pdf
- 8 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Anexos Firmados Digitalmente/042-1862187_TechnicalEnvelopeSummary (4).pdf
- 9 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento DD-01/001-DD-01.zip
- 10 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento DD-02/002-DD-02.zip
- 11 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento DD-03/003-DD-03.zip
- 12 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento DD-04/004-DD-04.zip
- 13 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-01/022-PE-01.zip
- 14 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-02/023-PE-02.zip
- 15 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-03/024-PE-03.zip
- 16 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-04/025-PE-04.zip
- 17 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-05/026-PE-05.zip
- 18 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-06/027-PE-06.zip
- 19 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-07/028-PE-07.zip
- 20 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-08/029-PE-08.zip
- 21 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-09/030-PE-09.zip
- 22 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-10/031-PE-10.zip
- 23 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-11/032-PE-11.zip
- 24 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-12/033-PE-12.zip
- 25 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-13/034-PE-13.zip
- 26 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-14/035-PE-14.zip
- 27 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-15/036-PE-15.zip
- 28 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-16/037-PE-16.zip
- 29 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-17/038-PE-17.zip
- 30 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PE-18/039-PE-18.zip
- 31 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-01/005-PT-01.zip
- 32 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-02/006-PT-02.zip
- 33 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-03/007-PT-03.zip
- 34 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-04/008-PT-04.zip
- 35 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-05/009-PT-05.zip
- 36 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-06/010-PT-06.zip
- 37 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-07/011-PT-07.zip
- 38 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-08/012-PT-08.zip
- 39 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-09/013-PT-09.zip
- 40 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-10/014-PT-10.zip
- 41 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-11/015-PT-11.zip
- 42 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-12/016-PT-12.zip
- 43 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-13/017-PT-13.zip
- 44 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-14/018-PT-14.zip
- 45 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-15/019-PT-15.zip
- 46 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-16/020-PT-16.zip
- 47 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/Documento PT-17/021-PT-17.zip
- 48 /rfq_958716_tech/OBRA CIVIL_TRITURA-113985/supplier.txt
- 49 /rfq_958716_tech/rfq.txt



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 41

| Nombre del Archivo | |
|--------------------|--|
| 1 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_DD-01/001-DD_01.pdf |
| 2 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_DD-02/002-DD_02.rar |
| 3 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_DD-03/003-DD_03.pdf |
| 4 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_DD-04/004-DD_04.pdf |
| 5 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PE-01/022-PE-01Carta_compromiso.pdf |
| 6 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PE-02/023-PE-02_PU.zip |
| 7 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PE-03/024-PE-03_MATER.pdf |
| 8 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PE-04/025-PE-04_MO.pdf |
| 9 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PE-05/026-PE-05_MAQ.pdf |
| 10 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PE-06/027-PE-06A_FASAR.pdf |
| 11 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PE-07/028-PE-07_COSTO_HORARIO.pdf |
| 12 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PE-08/029-PE-08_INDIRECTOS.pdf |
| 13 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PE-09/030-PE-09_FINANCIAMIENTO.pdf |
| 14 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PE-10/031-PE-10_UTILIDAD.pdf |
| 15 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PE-11/032-PE-11_CARGOS_ADICIONALES.pdf |
| 16 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PE-12/033-PE-12_BASICOS_DE_MAT.pdf |
| 17 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PE-13/034-PE-13_CATALOGO.zip |
| 18 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PE-14/035-PE-14_PROGRAMA_GRAL.pdf |
| 19 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PE-15/036-PE-15_PROG_MAT.pdf |
| 20 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PE-16/037-PE-16_PROG_MO.pdf |
| 21 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PE-17/038-PE-17_PROG_MAQ.pdf |
| 22 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PE-18/039-PE-18_PROGRAM_PERSONAL_TEC_ADM.pdf |
| 23 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PT-01/005-PT_01_Conocer_el_sitio.pdf |
| 24 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PT-02/006-PT_02_Planeación.zip |
| 25 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PT-03/007-PT_03_Capacidad_del_personal.zip |
| 26 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PT-04/008-PT_04_Experiencia_de_la_empresa.zip |
| 27 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PT-05/009-PT_05_Manifestaciones.pdf |
| 28 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PT-06/010-PT_06_Trabajos_a_subcontratar.zip |
| 29 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PT-07/011-PT_07_Capacidad_financiera.zip |
| 30 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PT-08/012-PT_08_Equipo.zip |
| 31 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PT-09/013-PT_09_Modelo_de_contrato.zip |
| 32 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PT-10/014-PT_10_Manifestación_de_precios.pdf |
| 33 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PT-11/015-PT_11_Manifestación_de_conformidad_con_el_convenio.pdf |
| 34 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PT-12/016-PT_12_Mano_de_obra_local.pdf |
| 35 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PT-13/017-PT_13_Personal_con_discapacidad-.pdf |
| 36 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PT-14/018-PT_14_Manifestación_SAT.pdf |
| 37 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PT-15/019-PT_15_IMSS.pdf |
| 38 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PT-16/020-PT_16_INFONAVIT.pdf |
| 39 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/Documento_PT-17/021-PT_17_Conocer_términos.zip |
| 40 | /rfq_958716_tech/OBRAS_MARITIMAS_HB-16978/supplier.txt |
| 41 | /rfq_958716_tech/rfq.txt |



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 47

| Nombre del Archivo | |
|--------------------|---|
| 1 | /rfq_958716_price/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Anexos Firmados Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary_procisa.pdf |
| 2 | /rfq_958716_price/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Anexos Firmados Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary_procisa.pdf rpt.pdf |
| 3 | /rfq_958716_price/PROYECTOS DE OBRA C-319464/supplier.txt |
| 4 | /rfq_958716_price/rfq.txt |
| 5 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Anexos Firmados Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary_procisa.pdf |
| 6 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Anexos Firmados Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary_procisa.pdf rpt.pdf |
| 7 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento DD-01/001-DD 01.pdf |
| 8 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento DD-02/002-DD 02.pdf |
| 9 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento DD-03/003-DD 03.pdf |
| 10 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento DD-04/004-DD 04.pdf |
| 11 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-01/022-PE 01.pdf |
| 12 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-02/023-PE 02.pdf |
| 13 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-03/024-PE 03.pdf |
| 14 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-04/025-PE 04.pdf |
| 15 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-05/026-PE 05.pdf |
| 16 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-06/027-PE 06.pdf |
| 17 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-07/028-PE 07.pdf |
| 18 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-08/029-PE 08.pdf |
| 19 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-09/030-PE 09.pdf |
| 20 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-10/031-PE 10.pdf |
| 21 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-11/032-PE 11.pdf |
| 22 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-12/033-PE 12.pdf |
| 23 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-13/034-PE 13.pdf |
| 24 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-14/035-PE 14.pdf |
| 25 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-15/036-PE 15.pdf |
| 26 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-16/037-PE 16.pdf |
| 27 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-17/038-PE 17.pdf |
| 28 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PE-18/039-PE 18.pdf |
| 29 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-01/005-PT 01.pdf |
| 30 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-02/006-PT 02.pdf |
| 31 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-03/007-PT 03.zip |
| 32 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-04/008-PT 04.zip |
| 33 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-05/009-PT 05.pdf |
| 34 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-06/010-PT 06.pdf |
| 35 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-07/011-PT 07.pdf |
| 36 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-08/012-PT 08.pdf |
| 37 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-09/013-PT 09.pdf |
| 38 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-10/014-PT 10.pdf |
| 39 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-11/015-PT 11.pdf |
| 40 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-12/016-PT 12.pdf |
| 41 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-13/017-PT 13.pdf |
| 42 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-14/018-PT 14.pdf |
| 43 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-15/019-PT 15.pdf |
| 44 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-16/020-PT 16.pdf |
| 45 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/Documento PT-17/021-PT 17.pdf |
| 46 | /rfq_958716_tech/PROYECTOS DE OBRA C-319464/supplier.txt |
| 47 | /rfq_958716_tech/rfq.txt |

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.
